

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION – KICK OFF

PV REUNION 00

Place, Date, Heure : **Siège BPI & TEAMS, 27/09/2022, de 10h30 à 11h45**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Eric VAN CROMBRUGGE Frédéric LESIRE Harold BURNET Nuria GOMEZ FRIAS	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : evancrombrugge@bpi-realestate.com E : flesire@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	 X X X X X	 X X X X X X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Kevin YANG Jean-Baptiste SOHIER Technicien de chantier Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 499 77 52 19 E : kevin.yang@bpc.be T : +32 476 85 42 64 E : jean-baptiste.sohier@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be	X X X	 X X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Marie COUDERC – Collaboratrice Alexane BOBICHON – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	 X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Aleksandra PACE	T : E : apa@tpf.be	X	X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be	X	X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be		X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN Clément GUYARD	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be T : E : c.guyard@jnc.be		X X
COORD SECURITÉ SANTÉ COSEP	CSS	Anne WINKIN Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 G : +32 499 05 49 87 E : anne.winkin@cosep.be E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Jeudi 06/10/22 de 13h à 16h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 27/09/22	<u>Organisation des réunions de chantier</u> A partir de dorénavant, des réunions hebdomadaires sont prévues tous les jeudis à 13h pour faire démarrer l'exécution du chantier du lot I. STAB et TS précisent qu'ils ne pourront être présents à la réunion du 06/10.	TOUS TS STAB	
1.2. 27/09/22	<u>Organisation administrative chantier</u> EG précise qu'il va mettre en place pour le lot I une plateforme COOPERLINK identique à celle du lot H. Cette plateforme permettra à tous de consulter et réaliser les différentes actions attendues par chacun sur les différents documents (plans, fiches techniques, ...) générés pour le chantier.	TOUS	
1.3. 27/09/22	<u>Nombre d'emplacements de parking</u> Sur question du MO, AR précise que le nombre de places de parking dans le projet sont réparties comme tel dans les derniers documents de PU : Sous-sol -1 : 33 Emplacements accessibles au « public » 22 emplacements de parking « Acquéreurs » Sous-sol -2 : 58 emplacements de parking « Acquéreurs »	AR MO	
1.4. 27/09/22	<u>Descriptif commercial :</u> Le descriptif est quasiment prêt chez le MO. MO diffusera ce descriptif à TOUS pour commentaires/vérification. Pour rappel, c'est ce descriptif qui est la référence absolue des prestations de travaux à réaliser, et on ne peut en aucun cas y déroger.	TOUS	

2. PLANNING

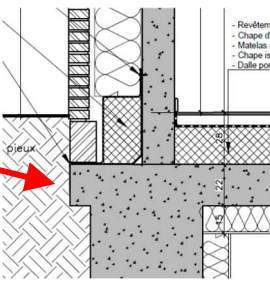
Date contractuelle début de chantier :

Délai contractuel de base : ??? jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privés : ???
------------------	----------------------

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. 27/09/22	<u>Planning Exécution</u> EG précise qu'il va réaliser un planning d'exécution intégrant les plannings amont de fourniture des documents. Sur demande du MO, EG transmettra pour le 3 octobre prochain le planning amont de fourniture des documents par les différents B.E.	TOUS EG	03/10/22
-------------------------	--	------------------------------	-----------------

2.2.	Avancement chantier		
2.3.	Dates prévisionnelles		
3. DECOMPTES			
3.1. 27/09/22	<u>Variantes projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO	
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1.			
5. STABILITE			
5.1. 27/09/22	<u>Coordination des plans STAB :</u> EG a reçu le dossier de plans de coffrage de STAB. EG doit vérifier que ces plans de coffrage sont conformes à l'offre de prix (dossier ADJ) précédemment rentrée par EG. STAB précise que les remarques faites par AR dans son mail du 04/07/22 ne sont pas encore intégrées dans cette diffusion de plan. Un dessinateur est occupé à intégrer ces modifications en ce moment chez STAB. STAB transmettra ses plans de coffrage remis à jour dès que finalisés.	STAB	
5.2. 27/09/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> EG demande à STAB d'étudier la possibilité de prévoir une rigole périphérique dans le sol du -1, pour récupérer l'eau qui percolerait au travers de la paroi de pieux. Le sol du -1 est normalement réalisée avec la chape de compression directement lissée à l'hélicoptère, en 1 seule phase de pose. Au -2, cette rigole est déjà prévue dans les plans puisque la chape est rapportée en seconde phase.	STAB	
5.3. 27/09/22	<u>Voiles de pieux :</u> Sur question de AR, EG et STAB précisent que les voiles de pieux seront bien de 52 ou 53cm d'épaisseur théorique. Sur les plans de AR, ces voiles sont actuellement dessinés à 60cm. On garde l'alignement intérieur des pieux ; pas d'augmentation de surface dans les sous-sols. Le niveau des poutres de ceinture des voiles de pieux avait déjà été transmise par AR. Elle est coordonnée sur les plans STAB. AR précise qu'il avait prévu un talon de pose des maçonneries de parement en tête des poutres de ceinture. EG précise que ces talons sont relativement compliqués à mettre en œuvre. EG préfère systématiser l'utilisation des cornières type KORBO.	STAB	
			
6. ARCHITECTURE			
6.1. 27/09/22	<u>Dossier d'exécution :</u> AR précise que lundi prochain, il éditera les plans du projet au stade « Exécution ». Certaines petites modifications ont une incidence sur le calcul des quotités. Il s'agit principalement d'adaptations faites pour la trémie technique de ventilation parking et le déplacement des dévidoirs incendie dans le noyau F. MO précise qu'il a encore fait des remarques sur les plans de commercialisation. A prendre en compte dans les corrections de plans encore à finaliser par AR.	MO AR	
7. TECHNIQUES SPECIALES			
TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
7.1. 27/09/22	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> TS précise qu'il a fait toutes les demandes chez SIBELGA (eau et gaz), VIVAQUA et PROXIMUS. Toutes les offres reçues ont été transmises au MO.	MO	

7.2. 27/09/22	<u>Coordination gaines techniques</u> MO demande à AR de vérifier la coordination des plans AR avec les installations TS et la présence des poutres au plafond du -1, pour éviter d'avoir des percements en pieds de trémies qui se trouveraient dans l'encombrement de poutres du haut -1.	AR TS STAB	
7.3. 27/09/22	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> TS précise qu'il n'a pas encore reparlé à VIVAQUA de la demande de dérogation pour encore placer les compteurs eau froide des appartements en-dessous les dévidoirs incendie ; donc plus bas que les exigences actuelles de VIVAQUA pour poser les compteurs, à une hauteur comprise entre 1,00m et 1,80m. AR précise que si la dérogation n'est pas envisageable, AR propose de placer les compteurs sur l'extrados de l'alcôve dans laquelle se trouve le dévidoir incendie, donc, à l'intérieur de la cage d'escalier. Cela nécessite un 2 ^e portillon dans l'escalier. C'est notamment ce qui a été prévu dans le lot F2. Une autre solution est de placer les compteurs d'eau dans le fond de l'alcôve, à bonne hauteur, et de placer le dévidoir incendie devant les compteurs, sur un support pivotant. Il faut alors vérifier que la profondeur actuelle des alcôves est compatible.	TS	
7.4. 27/09/22	<u>Sprinklage :</u> TS confirme qu'il a prévu un surpresseur pour le sprinklage. Dans ce lot, en effet, les pompiers ont demandé un sprinklage du parking et des locaux de parking vélos, à causes des risques liés aux recharges de batteries. TS précise que des tests de pression avaient été réalisés, mais que depuis lors, des immeubles supplémentaires se sont construits sur le site. MO précise que normalement, les conduites VIVAQUA devaient tenir compte dès le début du nombre total de logements prévus sur l'ensemble du site. TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue.		
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
7.5. 27/09/22	<u>Cabine haute tension :</u> AR précise que suite à l'intégration de l'ascenseur et de l'escalier « Vélos », il a fallu modifier le l'entrée du local haute tension au -1. Il manquait un sas pour ce local. AR doit vérifier avec TS si les nouvelles dimensions de cette cabine H.T. sont OK pour SIBELGA, même si pour le moment, il n'est pas prévu qu'on installe les transfos d'abaissement de la haute tension. TS précise que dans les dossiers actuels de nouveaux parkings, même s'il n'est pas prévu de cabine haute tension dès le départ, SIBELGA impose qu'un local soit dédié à cet usage dans le projet de sorte que dans le futur, une cabine H.T. puisse être implantée. Sinon, SIBELGA ne fournira jamais plus que les 250A basse tension actuellement prévus. Or, les réglementations urbanistiques actuelles vont dans le sens d'une imposition de prévoir l'infrastructure nécessaire pour que l'ensemble des places de parking puissent être équipées à terme d'une borne électrique.	AR TS	
7.6. 27/09/22	<u>Compteur haute capacité pour recharge voitures électriques :</u> Comme pour le lot H, SIBELGA demande que le compteur 250A qui est le plus gros compteur possible fourni en basse tension, pour alimenter les bornes électriques pour voitures soit placé dans un local compartimenté Rf 1h dédié. Il faut vérifier si possible de rajouter ce compteur dans le local compteur général du projet, juste à côté du local Haute tension. Ce local permet sans problème de rajouter l'armoire électrique de L 100cm x P 40cm x H 200cm (données reçues pour le lot H) demandée par SIBELGA.	TS	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
7.7.			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
7.8.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
7.9.			
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
7.10. 27/09/22	<u>Choix du fournisseur des ascenseurs :</u> Sur question de AR, EG précise que l'ascensoriste est quasiment désigné. Ce devrait être KONE qui sera choisi.		

	AR précise qu'en fonction du choix de l'ascensoriste, il se peut que les hauteurs de linteaux de baies doivent être légèrement adaptées. AR précise également qu'au sous-sol -1, en fonction du niveau de la dalle du sas d'entrée au Rez, on sera un peu juste en hauteur pour placer les portes palières sur la dalle d'étage. C'est notamment le cas dans le hall F. Dans ce cas, il faut peut-être envisager de placer les 3 portes sous-sols et Rez bas dans la trémie plutôt que sur la dalle ; ce qui peut avoir une incidence sur la dimension de la trémie et de la fosse.		
8. CONSEILLER PEB			
8.1. 27/09/22	<u>Isolation sous dalle plafond -1 :</u> PEB a revu ses calculs de performances énergétique des appartements, et, de ce fait, a revu les implantations de panneaux de laine minérale + Heraklith au plafond du -1. AR doit intégrer ces implantations d'isolants dans ses plans.	AR	
9. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
10. ACOUSTIQUE			
10.1.			
11. ABORDS			
11.1.			
11.2.			
12. POINTS POUR MEMOIRE			
12.1.	ARCHITECTURE		
12.2.	STABILITE		
12.3.	PEB		
12.4.	ABORDS		
