

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 18

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 30/03/2023, de 9h00 à 12h30**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Eric VAN CROMBRUGGE Frédéric LESIRE Elise HENDRICKX Harold BURNET Nuria GOMEZ FRIAS	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : evancrombrugge@bpi-realestate.com E : flesire@bpi-realestate.com T : 0497/514.587 E : ehendrickx@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	X X 	X X X X X X X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Kevin YANG Jean-Baptiste SOHIER Technicien de chantier Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet Geoffroy JOORIS Responsable Méthode Exécution	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 499 77 52 19 E : kevin.yang@bpc.be T : +32 476 85 42 64 E : jean-baptiste.sohier@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be T : +32 497 51 42 82 E : geoffroy.jooris@bpccgroup.be	X Part Part	X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Julien OBEDIA – Collaborateur Alexane BOBICHON – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	X X X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : E : apa@tpf.be	X	X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be	X	X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be		X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN Clément GUYARD	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be T: E : c.guyard@jnc.be		X X
COORD SECURITÉ SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assisté à la réunion dont mention est faite en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Jeudi 30/03/23 de 09h à 11h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 30/03/23	PV chantier sur COOPERLINK : MO précise qu'il n'a pas accès à tous les PV sur COOPERLINK. Pourtant, AR a déposé l'ensemble des PV sur la plateforme. AR va vérifier s'il n'y a pas un problème de partage.	EG	
1.2. 30/03/23	Organisation des réunions : MO propose que les points STAB soient traités à partir de 9h. TS viendrait en réunion à partir de 10h, 10h30 pour ses points spécifiques. TS précise que tant que les études des sous-traitants ne sortent pas, il ne viendra qu'une semaine sur 2.	TOUS	

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	152			610
Du 16/03/23 au 23/03/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	159	0	0	603

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. 06/10/22 30/03/23	Avancement chantier <u>Général</u> • Terrassements terminés sauf rampe de descente de la machine à pieux. • Renforcement sol par chaulage, pour circulation forage pieux, terminé • Forage des pieux des dés de fondations en cours dans la zone 1 • Grue GT2 en cours de montage.		
2.2. 19/01/23 09/02/23	Dates prévisionnelles La grue GT1 sera posée sur le radier du -2 début avril.		
2.3. 02/03/23 16/03/23	Planning choix acquéreurs MO et EG vont refaire un planning plus détaillé pour permettre au MO d'augmenter la flexibilité et les délais de verrouillage des décisions tout en ne pénalisant pas EG.		

30/03/23 | En cours chez MO † EG

3. DECOMPTES

3.1. 27/09/22	<u>Variantes projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO
3.2. 30/03/23	<u>Variante isolant façade :</u> EG demande s'il est envisageable de varier l'isolant de façade, prévu en laine minérale, par des plaques de PUR. AR précise que cette variante doit tenir compte - De l'impact PEB (réduction de l'épaisseur pour arriver à la même valeur R). - De l'impact feu (mesures contre la propagation des incendies). - De l'impact taxonomie (à voir chez MO) - De l'impact acoustique des façades. - De l'impact écologique CO2 (performances propres à EG). AR vérifiera ces aspects avec les bureaux concernés.	PEB AR MO ACOU EG

4. VISITE DU CHANTIER

4.1.		
------	--	--

5. STABILITE


5.1. 27/09/22 30/03/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> EG précise qu'à ce jour, le planning de fourniture de documents (voir annexe au PV n°12, remise en annexe du présent PV) n'est pas tenu. La fourniture de documents, principalement ferrailage et plans silico est critique, à cause des délais très long de fourniture. SECO doit aussi encore approuver certains documents de STAB STAB précise que les plans coffrage et ferrailage des fondations, du radier et du haut -2 sont OK, Y/C approbation de SECO. Le haut -1 coffrage sera transmis cet après-midi. Le ferrailage suivra. Ensuite viendra le haut Rez.	STAB STAB
5.2. 27/09/22 08/12/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.	EG
5.3. 06/10/22 30/03/23	<u>Détails escaliers :</u> AR doit encore corriger une erreur qui s'est glissée dans le cartouche du plan de l'escalier A hors sol. Il est erronément indiqué que le plan est valable pour les escaliers D et E. EG demande aussi à AR d'adapter les noms des plans dans le listing, pour qu'il corresponde plus précisément aux plans. EG précise aussi que les alcôves des hydrants + compteurs d'eau seront probablement également réalisées en silico pour meilleure fixation des techniques. Encore en discussion avec le sous-traitant. Ne pas encore changer sur les plans AR.	AR
5.4. 13/10/22 26/01/23 02/03/23	<u>Saignées dans les voiles de béton :</u> EG demande aussi à STAB de préciser les limites de possibilités de saignées dans les voiles de béton. AR procédera à ce repérage après remise à jour des plans d'étages chez STAB où des optimisations avec changement de matériaux sont intervenues. En attente des retours de plans de coffrage des étages.	AR
5.5. 16/03/23 30/03/23	<u>Cabine haute tension :</u> Dans la cabine haute tension, il est prévu un contre mur maçonné. MO préfère qu'on prévoie un voile de béton qui sera plus étanche que le contre-mur. On part sur une épaisseur de 18cm à l'extrados des pieux. Epaisseur à confirmer par STAB pour garantir une bonne étanchéité. EG va aussi vérifier ce qu'il est possible de faire pour garantir une bonne étanchéité sans prendre trop d'épaisseur. EG précise que le contre-voile n'est peut-être pas la meilleure solution.	STAB

EG préfère laisser les pieux apparents ; ce qui permet de faire des injections au droit des fuites lorsqu'elles apparaissent.

MO précise que par son usage de cabine HT, le local ne sera plus aussi facilement visitable après la fin du chantier. Si des fuites apparaissent après cette période, il ne sera pas facile d'y remédier.

AR propose de rester sur la solution de base avec le mur maçonné en blocs de 9cm. Ce mur est maçonné sur un cheneau étanche qui évacuera l'eau vers le -2. Donc pas de risque d'avoir de l'eau qui percole dans le mur maçonné. Pas de risque non plus d'avoir des remontées capillaires depuis le pied du mur.

EG précise que le problème d'infiltration d'eau dans les alvéoles des hourdis est aussi à maîtriser, pour éviter que de l'eau ne ressorte du plafond, dans des caves privatives ou autres locaux techniques plus sensibles.

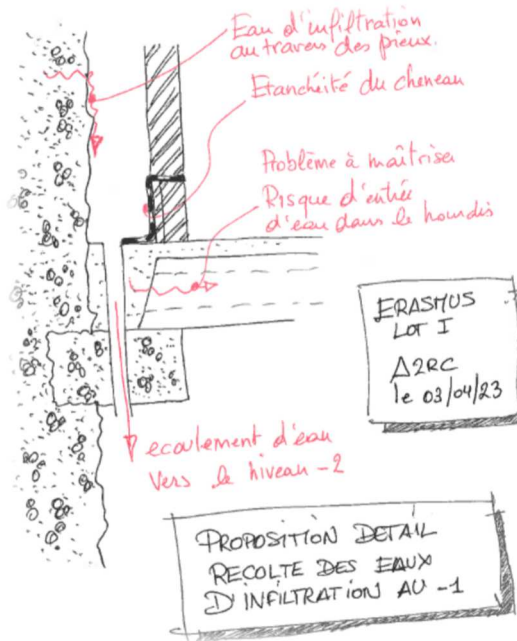

5.6.

30/03/23

Isolant sous dalle fondation escaliers :

EG demande à STAB de prévoir dans ses plans les isolants qui sont à prévoir sous le radier de fondation des escaliers A et F, y/c les retombées verticales des poutres de fondation. Ces isolants seront placés en coffrage perdu.

STAB

6. ARCHITECTURE

6.1.

06/10/22

16/03/23

Choix brique de parement :

AR a légèrement réduit le retrait des parties en brique posées verticalement car le rebord inférieur risque de se salir et donc il y a risque de voir apparaître des traces grises sur la façade en briques claires. Garder ce détail à l'œil pour vérifier s'il ne faut pas prévoir une petite cornière de rejet d'eau à ces endroits.

EG

AR

30/03/23

AR a vérifié en interne. Le risque de coulures semble très faible eu égard au faible décrochement d'alignement. Donc pas besoin de prévoir des cornières de rejet d'eau.

6.2.

12/01/23

Coordination des débouchés de ventilations en toiture.

TS et AR doivent encore faire la vérification des sorties de ventilation en toiture, pour s'assurer qu'aucune sortie de ventilation primaire sanitaire ou rejet d'air de ventilation ne se trouve à proximité des terrasses.

AR

TS

02/02/23

Encore à faire.

6.3.

09/03/23

30/03/23

Plans de façades.

Les élévations des façades ont été téléchargées sur la plateforme COOPERLTK.

AR

6.4.

09/03/23

Châssis.

EG demande à AR de préciser quelle est la teinte RAL des châssis, et si les châssis sont unicolores IN et OUT.

AR

30/03/23

Dans d'anciens documents de présentation du projet, AR a retrouvé la teinte préconisée pour les châssis, soit RAL 6012 (teinte vert noir).

MO demande à EG de fournir l'échantillon de couleur correspondant.

Teinte à confirmer par le MO + Préciser si on garde la même teinte IN et OUT.

MO

6.5.

02/03/23

16/03/23

Châssis local vélos Rez.

De ce fait, MO demande si nécessaire de conserver ces châssis.

AR précise que c'est OK pour supprimer les châssis, mais il faut adapter le détail d'encadrement de baie, pour :

1. Assurer l'étanchéité (empêcher l'eau de pluie de rentrer)

AR

TS

	2. Masquer avec un encadrement intérieur les couches d'isolants qui seront désormais visibles depuis l'intérieur. Voir si on prévoit un cadre acier, alu, bois ou autre à définir.		
6.6. 23/03/23 30/03/23	<u>Descentes d'eau pluviale.</u> EG précise qu'il y a des incohérences entre les plans / façades / détails AR. Les plans et élévations ont été mis à jour chez AR. Concernant la couleur des DEP, d'un document à l'autre, il y a des couleurs différentes. Sur les élévations 3D qui accompagnent le PU, les DEP sont foncées. Sur les élévations 3D de commercialisation, les DEP sont plutôt dessinées en clair (ton sur ton avec la brique). Choix encore à trancher par MO et AR.	MO AR	
6.7. 23/03/23 30/03/23	<u>Balcons préfabriqués.</u> AR pose la question de la teinte des balcons en béton architectonique à EG. Selon les documents, les teintes sont légèrement différentes. Sur les 3D du PU, les balcons sont blancs. Sur les 3D de commercialisation, les balcons sont gris clair. En fonction du choix de la brique, AR pense que les balcons gris ne seront pas très beaux, surtout que, contrairement au lot H, les tranches des balcons seront visibles (garde-corps fixés sur le dessus et non sur l'avant des rives des balcons). EG précise que la teinte blanche est plus chère que le gris qui a été défini dans le bon de commande. Et là je dis : désespoir de l'architecte 😞.	MO AR	
7. TECHNIQUES SPECIALES			
TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
7.1. 27/09/22 12/01/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO. TS a vérifié auprès de SIBELGA. Apparemment, il n'y a pas de dossier connu chez eux pour l'Elec et le gaz. TS leur transmet la référence dossier précédemment obtenue.		
26/01/23 16/02/23	TS relance VIVAQUA pour savoir où en sont les demandes de raccordements. MO a réussi à avoir VIVAQUA au tel. Mais pas encore de nouvelle sur le dossier.	TS	
7.2. 27/09/22	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> TS précise qu'il n'a pas encore reparlé à VIVAQUA de la demande de dérogation pour encore placer les compteurs eau froide des appartements en-dessous les dévidoirs incendie ; donc plus bas que les exigences actuelles de VIVAQUA pour poser les compteurs, à une hauteur comprise entre 1,00m et 1,80m.	TS	
30/03/23	EG a eu un contact avec une personne de VIVAQUA qui semble dire qu'on peut encore avoir la dérogation pour ce projet. EG a transmis les coordonnées de contact à la personne chez VIVAQUA. TS prendra contact avec lui pour les choses encore à définir pour ce projet. Pour documenter la demande de dérogation, AR doit transmettre la date d'introduction du permis initial + dépôt docs complémentaires et date délivrance permis.	AR	
7.3. 27/09/22	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue.		
17/11/22	MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille.		
26/01/23	TS précise que la citerne tampon pour le sprinklage doit faire 20000L. TS attend le retour de VIVAQUA sur la nécessité de prévoir cette cuve.	TS	
7.4. 30/03/23	<u>Désignation des sous-traitants :</u> EG précise que la plupart des sous-traitants techniques spéciales sont désignés : <u>Chauffage :</u> CAUVIN <u>Sanitaire :</u> LEGRAND <u>Ventilation :</u> BELVENT <u>Electricité :</u> HIFLOW <u>Sprinklage :</u> IFC <u>Astrid :</u> CONNEXT <u>Ascenseurs :</u> Encore à finaliser.		

TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
7.5. 16/03/23 23/03/23	<u>Modifications électriques acquéreurs :</u> Réflexion sur les possibilités de modifications le plus tard possible en cours chez MO et EG.	MO EG	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
7.6. 30/03/23	<u>Tracing chauffant conduites d'eau sprinklage et dévidoirs incendie :</u> EG demande si nécessaire de prévoir le tracing chauffant sur toutes les conduites d'eau des sous-sols. TS précise que pour certains projets, il prévoit de remplir les conduites d'eau glycolée. Ce qui les protège du gel. Mais il faut qu'il soit clairement indiqué dans le D.I.U. que l'eau consommée lors des tests annuels des dévidoirs ou circuits de sprinklage, soit à nouveau remplacée par de l'eau glycolée.	EG TS	
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
7.7.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
7.8.			
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
7.9. 27/09/22 09/03/23 16/03/23 30/03/23 7.10. 10/11/22 08/12/22	<u>Choix du fournisseur des ascenseurs :</u> Pour l'ascenseur vélos, sur les plans STAB, il n'y a pas de dalle de fond de fosse prévue à mi-hauteur du -2. C'est le radier qui sert de fond de fosse de grande profondeur. Cela semblait ennuyer certains ascensoristes. EG vérifiera si c'est mieux pour l'ascensoriste de remettre une dalle permettant de limiter la fosse du monte-charge vélos au strict nécessaire. <u>Ascenseurs de personnes :</u> Sur question de TS, on conserve les caractéristiques des largeurs de trémies d'ascenseurs du projet. La trémie de l'ascenseur F fait 165cm de large, tandis que les autres ascenseurs sont dans des trémies de 180cm de large. <u>Ascenseur vélos :</u> EG précise que selon le fabricant, la hauteur libre à prévoir au-dessus du dernier niveau desservi est de 370cm au lieu de 460cm tel que représenté dans les coupes AR. AR vérifiera les implications pour le local au-dessus de l'ascenseur, dans l'appartement A1A. Si la hauteur devient plus que 250, cela se transforme en chambre donc problème de précadastration et PU peut-être. Plan de détail Ascenseur et Escalier A sous-sol mis à jour chez AR. On arrive à une hauteur sous faux-plafond dans le local au-dessus de la trémie d'ascenseur de 228cm. Donc pas possible de l'intégrer comme pièce de vie. <u>Dimensions trémies ascenseurs :</u> La position des portes palières d'ascenseurs est bien prévue en trémie au sous-sol. AR précise que pour l'ascenseur F, la hauteur libre du sol -1 au sol sas Rez est très faible. Donc coupe Ascenseur à vérifier. AR va éditer ses coupes pour cet ascenseur.	AR	
8. CONSEILLER PEB			
8.1. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
8.2. 30/03/23	<u>Taxonomie et PEB :</u> Les incidences des choix PEB sur la taxonomie du projet sont encore à affiner chez MO. L'étude PEB du point de vue taxonomie n'est pas prévue dans la mission de PEB. Si cette étude doit être menée, il y a pour 1 semaine de calculs chez PEB. MO vérifie en interne l'impact et la nécessité de faire des compléments d'études.	AR	

9. COORDINATION SECURITE-SANTE

Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.

CSS

10. ACOUSTIQUE

10.1. Doublages acoustiques gaines techniques :

06/10/22

Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple).

ACOU

27/10/22

ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.

10.2. Principes acoustiques généraux :

27/10/22

08/12/22

Les principes des portes acoustiques sont encore à préciser.

ACOU
EG

11. ABORDS

11.1. Trainantes horizontales de reprise des DEP :

17/11/22

ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments.

En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.

ABO

11.2. Mise à jour dossier pour exécution :

23/03/23

Pour le bon suivi du dossier, EG demande que ABO place ses documents d'adjudication sur la plateforme COOPERLINK, de sorte qu'ils soient facilement accessibles par tous.

ABO

12. POINTS POUR MEMOIRE

12.1.

ARCHITECTURE

Parement façade :

Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige

Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771

Châssis :

12.2.

STABILITE

12.3.

PEB

12.4.

ABORDS

Annexe 1 au PV - Planning amont des documents à transmettre


Planning Amont: Plans BPE (Bon pour Exécution).

Chantier : Erasme lot I
Version du 03/02/2023

Poste	Date DIFFUSION des plans BPE STAB/TS/AR/ABO/MO
Architecture : Document liés au gros-œuvre	
Escaliers : Coupes toute hauteur	08-Feb-23
BALCONS : Principes, choix, implantation, dimensions figés (pour tous les étages)	16-Feb-23
Brique façade et calpinage briques	14-Mar-23
Techniques spécial	
Ascenseurs	31-Mar-23
Techniques en trémiés et à intégrer dans réalisation béton	02-Mar-23
Techniques en toiture	15-May-23
Stabilité	
Principes	
Escaliers	08-Feb-23
Balcons	16-Mar-23
Hourdis	08-Feb-23
Premurs	06-Feb-23
Predalles	15-Feb-23
Fondations	
Poutre de ceinture (coffrage et ferrillage)	30-Oct-23
Pieux du -2	13-Jan-23
Egouttage enterré	27-Jan-23
Bouée de terre	03-Feb-23
Fondations au -2 (poutres et d'os de fondations coffrage et ferrillage y compris fosses d'ascenseurs)	03-Feb-23
Couvrant -2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	13-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Feb-23
Couvrant -1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	27-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Mar-23
Couvrant Rez	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	15-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	15-Mar-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	05-Apr-23
Couvrant +1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	12-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	04-May-23
Couvrant +2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	16-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	09-May-23
Couvrant +3	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	06-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	09-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	02-Jun-23
Couvrant +4	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	26-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	30-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Jun-23
Couvrant +5	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	01-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	29-Jun-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	21-Aug-23
Couvrant +6	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Aug-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	07-Sep-23
Couvrant +7 (Acrotère et cabanons)	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	03-Aug-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	04-Sep-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	25-Sep-23

ERASME - LOT I planing AMONT _plans_2023.02.03
