

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 42

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 02/11/2023, de 09h00 à 12h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Frédéric LESIRE Elise HENDRICKX Harold BURNET	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : flesire@bpi-realestate.com T : 0497/514.587 E : ehendrickx@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	X	X X X X X X
	MO/COM	Nuria GOMEZ FRIAS		X	X X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Ludovic BRIARD Ingénieur de projet Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 493 76 84 47 E : ludovic.briard@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be	X	X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Alexane BOBICHON – Collaboratrice Anastasia SYMEONIDOU – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	X X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : +32 478 48 39 72 E : apa@tpf.be		X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be		X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS Ana AVRAM	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be E : peb.management@tpf.be		X X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be		X
COORD SECURITE SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Jeudi 09/11/23 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	OBJET	ACTION	DATE
1. GENERALITES - ADMINISTRATION			
1.1. 05/10/23	<u>Gestion adresses Cooperlink</u> Il est demandé à EG de rajouter l'adresse peb.management@tpf.be aux accès Cooperlink afin que PEB puisse avoir accès à la plateforme.	EG PEB	
1.2. 26/10/23	<u>Congés de Toussaint :</u> STAB ne sera pas présent la semaine prochaine (semaine 44). AR ne sera pas présent la semaine 45.	TOUS	

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Pério de précédente	762	376			386
Du 26/10/23 au 02/11/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	383	0	0	379

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. Avancement chantier

06/10/22
26/10/23

Général

- Maçonneries non portantes en cours au sous-sol -1
- Début pose des canalisations de gaz au plafond du -1, dans les zones sans isolant.
- Pose de la membrane nopée pratiquement finie au -2.
- Ferrailage dalle drainante -2 en cours de pose (80% fini).

Bloc A :

- Verticaux du +3 en cours

Bloc B :

- Couvrant du +2 fini

Bloc C :

- Couvrant du +2 fini

Bloc D :

- Couvrant du +2 en cours.

Bloc E :

- Verticaux du +2 en cours

Bloc F :

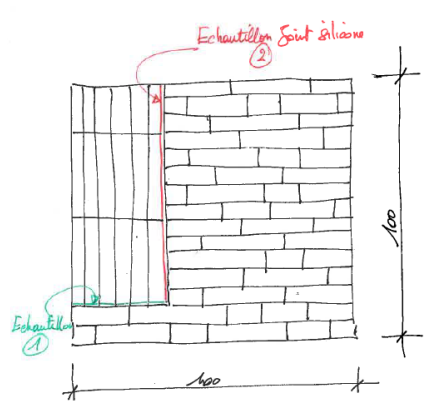
- Début verticaux du +2

3. DECOMPTES			
3.1. 12/10/23	<u>Adaptations PEB :</u> Suite aux résultats des encodages transmis par PEB, des adaptations sont à prévoir. Voir commentaire point 9.1 Isolation des sous-sols.	MO	
3.2. 02/11/23	<u>Étanchéité des carrelages :</u> Conformément à ce qui a été fait dans le Lot H précédemment, EG avait chiffré l'étanchéité sous les carrelages des SDB (entourage douches et baignoires) mais ce poste n'a pas été retenu dans le bon de commande final. EG recommande fortement de prévoir cette étanchéité. Selon EG, le choix du système d'étanchéité liquide ou via membrane n'a pas d'incidence sur le prix.	MO	
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1. 24/08/23 19/10/23	<u>Luminaire public trop proche d'un balcon, Avenue des Lilas :</u> Le luminaire de la façade Sud a été déplacé d'environ 1,50m vers la gauche. Il faut encore décaler le luminaire de la façade Est.	MO	
4.2. 26/10/23	<u>Blocage des pieds de volée d'escalier au sous-sol :</u> Pour la première volée du SS -1 vers le Rez de l'escalier E, EG doit vérifier la fixation de pied de volée.	EG	
5. STABILITE			
5.1. 27/09/22 19/10/23 26/10/23 02/11/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> <u>Acrotères en béton coulé / préfabriqué :</u> EG a fait, sur chantier, un échantillon d'acrotère préfabriqué avec tapis en fond de coffrage. La structure du tapis est légèrement grainée, est la même que la surface marchable du balcon. La teinte du béton a l'air grise, trop foncée. EG précise que cela est dû au fait qu'il a été coulé la veille. MO rappelle qu'il a été question de le peindre. L'option peinture reste envisageable si la teinte de béton des éléments mis en place, une fois complètement séché, ne convient pas à MO. Malgré la restriction concernant l'aspect, MO et AR acceptent l'échantillon. EG informe que tous les éléments d'acrotères d'un même étage seront réalisés en même temps, avec le camion de béton, afin de garantir l'homogénéité de couleur et de prise.	STAB EG MO	
5.2. 07/09/23 21/09/23 05/10/23	<u>Surcharge parement sur les hourdis :</u> EG a reçu la réponse du fabricant et l'étudie afin de sortir les détails. La pose du parement sur l'extrémité des hourdis est acceptable. Par contre, la surcharge de la pose du parement sur toute la longueur du hourdis est trop élevée. EG prévoit des cornières de reprise et finalise le dossier d'exécution.	EG	
5.3. 21/09/23 05/10/23 19/10/23 26/10/23	<u>Espacement des conduites de ventilation</u> STAB a confirmé à SECO et a apporté des justificatifs concernant les dalles. SECO a renvoyé une remarque sur Cooperlink disant qu'ils ne sont pas concernés et demandent à STAB de fournir un principe de pose approuvé. STAB va le transmettre à SECO. Encore à faire.	SECO STAB	
5.4. 12/10/23 19/10/23 26/10/23	<u>Resserrage supérieur des murs silico non-porteurs :</u> STAB doit confirmer à quel moment le resserrage au plafond peut être réalisé. Encore à faire. STAB confirme que le resserrage sera réalisé après que les étançons de l'étage aient été retirés.	STAB EG	

5.5. 19/10/23	<u>Têtes de mur entre escalier et palier :</u> SECO a fait une remarque sur la fragilité des têtes de mur des cloisons non-portantes entre l'escalier et le palier. La tête de mur DF245 fait partie de l'ensemble en L, elle est de ce fait contreventée par la cloison à l'arrière et donc stable. STAB va transmettre un principe pour ces têtes de mur à SECO.	STAB SECO
26/10/23	Encore à faire.	
5.6. 26/10/23	<u>Plan de sciage :</u> EG a transmis le plan de sciage à CARRO-FLOR, qui a besoin de 15cm entre les joints et les colonnes pour faire passer sa machine. Contrairement à ce qui a été dessiné dans les plans de AR, on décale les joints qui viennent des colonnes de 15cm. Le plan est en approbation pour SECO sur Cooperlink.	AR EG STAB SECO
5.7. 26/10/23	<u>Bordereau de poutres :</u> EG demande à STAB un bordereau des poutres de tous les étages restants et des poutres des acrotères pour préfabrication.	EG STAB
5.8. 26/10/23	<u>Fournisseur prédalle :</u> Après avoir subi une cyber attaque, l'ancien fournisseur est à l'arrêt. EG a vérifié que les plans du nouveau fournisseur sont identiques. STAB demande des les mettre sur Cooperlink pour approbation et pour le dossier AB.	EG STAB
02/11/23	Fait.	

6. ARCHITECTURE

6.1. 12/01/23 05/10/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> AR a adapté la toiture et attend les plans de EG/TS concernant les cabanons de toiture.	EG/TS
6.2. 09/03/23 05/10/23	<u>Châssis.</u> PEB a validé les notes de calcul sauf pour 6 appartements. EG a déjà passé commande pour les profilés châssis.	
12/10/23	EG a envoyé une nouvelle note de calcul à PEB avec une meilleure performance de profilé de châssis triple vitrage, pour les 6 appartements concernés.	
19/10/23	Suite aux discordances en élévation chez AR, AR vérifiera quels châssis oscillo-battants dans les séjours peuvent devenir des châssis simple ouvrant. En réunion, il a été décidé qu'il n'y aurait qu'un seul châssis oscillo-battant par séjour et par chambre. AR transmettra son plan à EG.	EG AR PEB
26/10/23	AR a envoyé les plans avec les oscillo-battants à supprimer.	
02/11/23	EG fait remarquer que la porte de l'escalier sous-sol du D s'ouvre vers l'intérieur. Il s'agit d'une sortie de secours ; la porte doit donc s'ouvrir dans le sens de la fuite, vers l'extérieur. AR corrige son plan.	
6.3. 21/09/23	<u>Suppression des maçonneries au sous-sol -1</u> EG va refaire un plan d'implantation avec SIBELGA (locaux compteurs gaz et compteurs électriques). EG précise que pour les caves privatives, EG transmettra le plan des réservations à laisser dans le haut des murs pour permettre la circulation d'air de ventilation d'une cave à l'autre, suivant les plans de ventilations à recevoir de la part de EG/TS.	
05/10/23	La position des compteurs et des murs de refend, proposée dans le plan de SS -1 par AR, est à valider par EG/TS.	EG/TS AR
26/10/23	AR remet à jour.	
02/11/23	Fait.	
6.4. 31/08/23 12/10/23	<u>Définition des garde-corps.</u> EG a déposé la note de calcul et le plan de principe pour les garde-corps sur Cooperlink.	EG
19/10/23	AR doit approuver la FT déposée par EG.	AR
26/10/23	Encore à faire.	
02/11/23	Fait.	
6.5. 05/10/23	<u>Raccord pied de façade :</u> Suite à l'ajout du L de soutènement en béton contre la terrasse du bâtiment C, AR doit revoir le raccord de la façade en brique. Il faut prévoir la cassure dans le jardin, due à la différence de niveau entre le bâtiment C et D.	ABO AR EG

6.6. 05/10/23 12/10/23	<u>Briques Ecobrick :</u> SECO informe que l'épaisseur d'isolant maximum est de 20cm et conseille de rester sur une brique de 9cm. EG propose de refaire des notes de calculs pour validation par SECO. MO valide l'appareillage proposé par AR. La note de calcul est en cours chez EG pour les fers à brique et les cornières de support. MO souhaite que EG réalise un mock-up pour valider le système de pose des ecobricks. EG va programmer la réalisation du mock-up avec plusieurs appareillages (verticaux, retraits, etc.) et avec les échantillons de joint silicone. 	EG AR SECO MO
6.7. 12/10/23	<u>Choix du joint silicone :</u> Des échantillons du joint seront proposés par EG, pour rester en ton sur ton avec les joints normaux de briques.	AR EG
6.8. 12/10/23 19/10/23 26/10/23	<u>Local vélos</u> Suite à l'encodage et à la simulation PEB, PEB demande que le local vélos soit remis dans le volume protégé. PEB a confirmé son souhait d'intégrer le local vélos dans le volume protégé. Cela implique de murer les baies de châssis. AR doit approuver. AR a adapté dans les plans. AR a posé des questions à PEB concernant les isolants à conserver autour du local vélo. En attente de réponse PEB.	AR PEB
02/11/23	Un isolant + Héraklith (TEKTALAN) 15cm était prévu contre l'appartement C.0.B. Il est conservé. L'isolation dans le sol est conservée. La porte du local vélo s'ouvre vers l'intérieur et est prévue avec un ferme porte. Si nécessaire, on prévoira un système pour maintenir la porte ouverte pendant qu'on rentre ou qu'on sort un vélo. Voir commentaire point 9.1 Isolation des sous-sols.	
6.9. 12/10/23 19/10/23	<u>Mise à jour des faux plafonds :</u> AR vérifie, si nécessaire, la présence des faux plafonds dans les petits locaux au rez-de-chaussée des blocs D-E-F (hauteur libre 340cm). MO propose d'y placer des faux plafonds à environ 270cm. Fait chez AR. Tous les faux plafonds non nécessaires sont retirés des plans AR et COM. Seuls quelques cas particuliers où on a des arrêts au milieu d'un linteau de porte ou pour aller jusqu'au bout de la branche d'un couloir en L qui est proche, sont prolongés légèrement. Donc pas de décompte. EG/TS et MO/COM vont se concerter afin de fournir à AR les faux plafonds nécessaires pour adaptation des plans EXE.	AR MO MO/COMM EG/TS
6.10. 02/11/23	<u>Saillie poutre au -1 à l'angle du bloc A :</u> Il y a une poutre qui déborde de l'alignement de façade au droit du bloc A, à l'angle des façades Ouest et façade intérieure patio. Elle sera complètement emballée dans l'étanchéité. Il faut trouver une solution pour la masquer car elle risque de sortir légèrement de l'alignement fini.	AR EG

7. GESTION ACQUEREURS

7.1. 22/06/23 14/09/23 05/10/23 26/10/23	<u>Plan techniques DESCO et CUISINES :</u> Contrairement à ce qui a été évoqué précédemment, MO confirme qu'on place bien toutes les cuisines dans les appartements invendus MO/COMM a reçu l'offre de base et attend les plans techniques MO/COMM informe que les délais de fourniture pour les plans techniques seront plus longs étant donné le déménagement des bureaux du cuisiniste. Le retard des cuisines est en cours de résorption et l'upgrade des appartements est en cours de mise à jour.	EG MO/COMM
7.2. 07/09/23	<u>Devis EG pour les modifications acquéreurs :</u> MO/COMM demande quand EG pourra répondre aux demandes de prix pour les modifications acquéreurs.	

05/10/23 02/11/23	EG précise qu'il devrait être en mesure de faire le chiffrage des demandes acquéreurs à partir d'octobre. MO/COMM va envoyer les devis acquéreur à EG. EG demande à MO de fournir la shopping list des prix des suppléments.	EG MO/COMM MO
7.3. 07/09/23	<u>Remplacement des baignoires par des douches :</u> MO/COMM a prévu de remplacer certaines baignoires par des tubs de douches. EG avait mentionné qu'à plusieurs endroits, on utilise le caisson de la baignoire pour réaliser les raccordements de décharges hors sol, lorsque les distances jusqu'aux trémies sont importantes. Dans ce cas, le passage à une douche est impossible. MO demande les plans PDF des étages à EG/TS, afin d'effectuer le repérage des baignoires qui vont changer en douche.	EG EG/TS MO/COMM
05/10/23		
7.4. 05/10/23	<u>Carrelage :</u> EG souhaite qu'une réunion avec QUADRUS soit organisée pour la mise au point des détails de fourniture des différents revêtements.	EG MO/COMM
26/10/23	La réunion avec EG et QUADRUS est prévue pour le vendredi 27/10/23. Concernant le carrelage des salles de bain/douche des blocs D-E-F (grande hauteur), si le faux plafond se situe en dessous de 250 cm, le carrelage est posé sur toute la hauteur. Si le faux plafond se situe au-dessus de 250cm, le carrelage est posé à hauteur de porte avec un module entier et le carrelage coupé se trouve au niveau du sol.	
02/11/23	La réunion a eu lieu. QUADRUS a précisé qu'il y a eu une restructuration des équipes et que les problèmes d'approvisionnement passés ne se reproduiront plus.	
7.5. 12/10/23	<u>Changement et upgrade de certaines cuisines :</u> MO/COMM modifie ses plans et informera AR pour adaptation des plans COM.	AR MO/COMM

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
8.1. 27/04/23 26/10/23	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion TS en présence de TS et EG/TS le jeudi 09/11/23	TS EG/TS	09/11/23
8.2. 27/09/22 12/10/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants - SIBELGA :</u> SIBELGA informe qu'il faut recommencer un nouveau dossier. Concernant le planning, il faut prévoir 2 mois pour l'offre ELEC et après cela 6 mois de délai pour exécution. MO informe que le rdv technique se tiendra le 26/10/23. Il faut prévoir l'implantation des tôles dans le sol de l'appartement du rez. SIBELGA a besoin de prévoir un boîtier de raccordement à planter hors sol. Il sera placé sur l'espace public contre la façade ouest. Le responsable du dossier chez SIBELGA est présent en réunion. <u>Cabine HT :</u> EG doit faire une proposition de plan d'aménagement de la cabine, à soumettre à SIBELGA pour approbation, malgré le fait qu'on soit en présence d'une cabine client. <u>Compteurs basse tension :</u> Il faut prévoir 89 compteurs, c'est-à-dire 6 ensembles de 15 compteurs de 2m de large chacun. Il faut aussi prévoir une armoire de raccordement de SIBELGA à l'entrée depuis la rue. Le mur de refend dessiné dans le local compteurs doit être rallongé jusqu'à 140cm du mur du parking.		
26/10/23			
02/11/23	EG/TS doit centraliser les informations afin de transmettre à SIBELGA les documents demandés.	EG/TS	
8.3. 26/10/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants - SIBELGA - Gaz :</u> Le responsable du dossier chez SIBELGA est présent en réunion. Pour le Gaz, on prévoit une cloison à 80cm des pieux, en laissant un passage du côté de l'angle du bâtiment. SIBELGA précise que normalement, sur cette longueur de mur, on devrait pouvoir y mettre tous les compteurs, et il y a possibilité d'en prévoir quelques-uns sur le retour de mur côté ascenseur B. Ne pas oublier de prolonger les ventilations hautes et basses en fonction de cette paroi rajoutée.	MO EG EG/TS TS	

8.4. 17/08/23	<u>Egouttage du couvrant parking intérieur d'ilot :</u> Voir paragraphe 12.2 - Lot Abords ci-dessous.		
8.5. 17/08/23 31/08/23	<u>Gestion partie « publique » du parking :</u> EG précise que le fournisseur du système décrit en base n'est pas encore désigné. AR précise qu'il faut étendre le système de gestion de la partie publique du parking aux accès à ce parking (escalier A et ascenseur vélos). Ces 2 accès doivent également recevoir un système de contrôle permettant une certaine restriction d'accès.	EG MO	
12/10/23	Sur question de EG, MO précise qu'il n'a pas encore su avancer sur le mode de gestion des accès au parking semi-public.		
02/11/23	EG va organiser une réunion avec un sous-traitant potentiel afin de présenter à MO les possibilités de contrôle d'accès.		
8.6. 28/09/23	<u>Entrée des impétrants - VIVAQUA :</u> MO rappelle que concernant les raccordements VIVAQUA, l'ouverture de dossier est faite, de même que les paiements des frais de raccordement. EG doit prendre contact avec VIVAQUA pour organiser le planning de VIVAQUA par rapport au chantier.	EG	
26/10/23	Suite contacts avec les responsables de VIVAQUA, EG/TS précise qu'il faut compter 1 mois entre la confirmation de commande et l'intervention sur site pour l'introduction de la conduite d'eau dans le bâtiment.		
8.7. 28/09/23	<u>Entrée des impétrants - PROXIMUS :</u> MO prend contact avec PROXIMUS pour vérifier ou en est le dossier, et pour pouvoir transmettre les données du dossier à EG qui reprendra ensuite le suivi pour planifier l'entrée des impétrants et les raccordements.		
26/10/23	Ni MO, ni EG n'ont de nouvelles de PROXIMUS.	MO	
8.8. 05/10/23	<u>Raccordement eaux usées/eaux pluviales à l'égouttage public :</u> MO a donné une mission externe au bureau HCO afin de recalculer les eaux. Une réunion a été tenue en TEAMS le 03/10/23.		
26/10/23	MO n'a pas encore de retour de HCO.		
02/11/23	MO a eu un contact avec HCO lundi 30/10/23, qui l'a informé qu'il transmettrait ses calculs pour le vendredi 03/11/23.	MO HCO	03/11/23
8.9. 12/10/23	<u>Gestion des bornes de recharge voitures électriques :</u> La localisation des armoires de gestion des bornes de recharge voitures doit encore être finalisée. Les équipements sont actuellement prévus dans le local surpresseur, contre la façade. Mais comme on supprime le contre-mur devant les pieux, il faut vérifier ou on place les armoires et équipement du gestionnaire des bornes électriques.	MO	
02/11/23	Il faut les maintenir le plus près possible de la cabine HT.		
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.10. 27/04/23 31/08/23	<u>Cabine haute tension :</u> TS précise que la présence de la cabine HT est mentionnée dans la demande de raccordement Elec SIBELGA.		
28/09/23	Plus d'infos devraient être disponibles suite à la réunion programmée chez SIBELGA la semaine prochaine (voir point 8.3 ci-dessus).		
12/10/23	Suite à la réunion de la semaine passée avec SIBELGA, MO confirme que la cabine HT client est obligatoire pour les parties communes (parkings, cages d'escaliers et ascenseurs, bornes électriques). Seules les alimentations électriques des appartements se feront en basse tension. Mais les 2 dossiers (introduction basse tension et haute tension) sont néanmoins gérés ensemble. Ce qui pose problème à EG qui a besoin d'alimenter les appartements en électricité pour pouvoir mettre le chauffage en route (séchage des plafonnages, ...).		
26/10/23	TS précise qu'il faut prévoir un système de réarmement automatique en cas de coupure de courant réseau, pour éviter les coupures de courant trop longues dans les parties communes de l'immeuble.		
8.11. 31/08/23	<u>Alimentation électrique des appartements :</u> TS précise qu'en vérifiant les FT et plans d'exécution sur COOPERLINK, il a remarqué que certains appartements sont alimentés en triphasé alors que l'installation est en monophasé. EG/TS précise que c'est prévu pour permettre une modification ultérieure sans devoir tout recâbler.		

28/09/23	TS demande aussi à EG/TS de transmettre les notes de calcul des alimentations des appartements depuis les compteurs privatifs, pour vérifier la pertinence des raccordements en 10 ² et/ou en 16 ² . Calculs encore à fournir par EG/TS.	EG/TS	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.12. 26/05/23 17/08/23	<u>Implantation des équipements locaux compteurs.</u> Modification des sens et positions des portes encore à mettre à jour sur les plans AR. Encore à mettre à jour chez AR. Suppression du contre-mur aussi à prévoir dans les locaux compteur eau / local surpresseur et local transfo d'isolement. Tous les équipements présents sur cette cloison sont placés sur le mur côté parking. Mis à jour chez AR et en attente de confirmation par EG/TS + SIBELGA.	EG/TS AR	
12/10/23			
8.13. 21/09/23	<u>Raccordement égouttage public</u> Le raccordement à l'égouttage public ne pourra pas se faire au niveau de la cave n°13 située au sous-sol -1. Le passage des pieux devra être déplacé et EG va faire un relevé des raccordements.		
8.14. 12/10/23	<u>Raccordement aux trémies d'appartements :</u> Suite à des échanges de mail, EG/TS et TS ont vérifié leurs calculs respectifs. Sur base des principes de TS, EG/TS va étudier ce qui peut être amélioré et mettre à jour les plans EXE.	EG/TS TS	
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.15.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.16. 21/09/23	<u>Gestion d'humidité/condensation</u> MO précise que le problème de condensation survient principalement lorsqu'il fait chaud à l'extérieur. L'air est donc souvent chargé de plus d'humidité. Dans ce cas, lorsque cet air extérieur chaud et humide est injecté dans les caves qui sont fraîches, il y a beaucoup de condensation qui se dépose sur les parois. TS précise qu'une solution peu onéreuse serait de rajouter des hygromètres sur les gaines d'entrée d'air frais des circuits de ventilation des locaux sous-sols. Ces hygromètres permettront de diminuer la vitesse, voire d'arrêter les groupes de ventilation pendant les périodes de taux d'humidité dans l'air, élevé.	TOUS	
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.17. 31/08/23 21/09/23	<u>Vérification des plans d'exécution :</u> Représentant KONE présent à la réunion. KONE va mettre à jour ses documents pour validation suite aux remarques de TS, AR et EG. AR doit transmettre à KONE le sens d'ouverture des portes d'ascenseur afin que KONE définisse la position des BlueKits (dimension minimale 57 x 45 cm). KONE transmettra également un prix pour la finition stratifié des parois latérales. AR doit transmettre le sens d'ouverture des portes d'ascenseur à KONE		
21/09/23	<u>Finitions cabines :</u> Ascenseur vélos : inox 3.16. (Résistant aux intempéries) pour toutes les faces Ascenseurs de personnes : inox pour les portes des ascenseurs A ->F et stratifié chêne clair pour les parois latérales. Tous les ascenseurs : réservation sol de 23 mm pour carrelage.		
19/10/23	EG/TS précise qu'il n'a pas encore eu de retour de l'ascensoriste suite aux remarques faites en réunion.	EG/TS	RAPPEL
9. CONSEILLER PEB			
9.1. 14/09/23	<u>Isolation des sous-sols :</u> EG a proposé de remplacer une partie des isolants du sous-sol (plafonds) par du MULTIPOR au lieu de la laine minérale / Heraklith prévus initialement. Le MULTIPOR est en effet moins sensible à l'humidité ; ce qui permet de démarrer les travaux de pose de cet isolant plus tôt pour améliorer les plannings de pose des techniques (surtout conduites gaz) au plafond du sous-sol. AR ne voit pas de contre-indication.	EG	
21/09/23	Retour de PEB demandé sur cette proposition de variante. MO propose de préparer un listing de questions précises pour PEB à transmettre pour lundi 25/09/23 afin de préparer la réunion du jeudi 28/09/23 (isolation des façades,		

28/09/23 05/10/23	isolation sous-sol, châssis). Une question concernera notamment la façade latérale orientée SO dont l'héraklith passe de 22.5 à 25cm. Réunion reportée d'une semaine. PEB sera présent à la réunion du 05/10/23 PEB valide les 25 cm de laine minérale pour la façade latérale orientée SO. PEB va envoyer un croquis pour compréhension. Concernant la rampe de parking, AR doit corriger la coupe erronée où il manque l'isolation Tektalan au plafond. PEB va faire des encodages et simulations afin de renvoyer les conclusions pour décision. A propos de l'isolation trémies ascenseur et trémies techniques en toiture, PEB confirme qu'il faut une valeur $u = 0.024$. Pour les parois verticales, PEB propose un isolant PUR de 10 cm ou LM de 14 cm. Pour les parois horizontales, PEB préconise une épaisseur de 30cm de PUR. PEB a reçu et encodé les FTE châssis et vitrage. Il en ressort qu'il faut améliorer les performances des châssis de 6 appartements. EG a questionné son fournisseur sur la possibilité d'ajouter des isolants complémentaires dans les profilés. EG propose de remplacer localement l'isolation des façades par du PUR à la place de la LM. PEB informe que cela fonctionne avec 22 cm d'isolant PUR sauf pour l'appartement A0A pour lequel il faudrait une isolation complémentaire au plancher : NESTAAN 20 cm de PUR projeté par couche de 3 à 4cm. PEB doit confirmer l'ensemble après encodage.	PEB	05/10/23
12/10/23	PEB a envoyé les conclusions suite à l'encodage. EG a transmis une FT de profilés de châssis amélioré afin que PEB encode les nouvelles valeurs. EG souhaite que PEB soit présent à la prochaine réunion le 19/10/23.		
26/10/23 02/11/23	Souhait de EG de voir PEB à la réunion de chantier du 02/11/23. EG demande de fixer un rdv visio avec PEB pour la semaine 46.		
10. COORDINATION SECURITE-SANTE			
10.1. 26/10/23	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier. <u>Présence de CSS aux réunions de chantier :</u> MO précise qu'il faut organiser des réunions régulières de la cellule de coordination, en présence de tous les bureaux d'études et de l'entreprise. MO contacte CSS afin d'organiser de telles réunions régulièrement.	CSS MO CSS	
11. ACOUSTIQUE			
11.1. 26/10/23	<u>Approbation des FT :</u> EG rappelle qu'AC doit approuver les FT qui la concerne sur Cooperlink. EG contacte AC pour mise à jour.	EG AC	
12. ABORDS			
12.1. 06/07/23 14/09/23	<u>Terrasse appartement D.0.A :</u> ABO doit encore faire la mise à jour de son plan d'aménagement pour rajouter la terrasse de l'appt D.0.A. Solution pour aménagement de cette terrasse encore à mettre au point chez ABO.	ABO	
12.2. 17/08/23 28/09/23	<u>Récolte des eaux du couvrant parking intérieur d'ilot :</u> ABO a transmis les quantités d'eau de pluie qui sont à récolter pour l'espace du patio. Il faut vérifier comment la récolte de ces eaux de pluie se répartit dans les raccordements existants ou non. Normalement, pour le permis d'environnement, des quantités d'eau de pluie ont aussi été définies. On peut vérifier les chiffres donnés pour comparaison.	ABO ABO	
12.3. 14/09/23	<u>Aménagement patio central :</u> MO demande à ABO de faire des propositions de variantes pour réduire les coûts des bancs et tables, ainsi que les coûts des bordures en acier corten délimitant les zones de gravier.	ABO	
13. POINTS POUR MEMOIRE			

13.1.

ARCHITECTURE

Parement façade :

Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige
Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771

Balcons béton architectonique :

Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70

Châssis :

Choix teinte IN et OUT : RAL 6012 Mat (vert noir)
Profilé de marque ALUK et modèle Triton Revive

DEP :

Teinte RAL 6012 Mat (vert noir)

13.2.

STABILITE

13.3.

TECHNIQUES SPECIALES

Choix des sous-traitants :

<u>Chauffage :</u>	CAUVIN
<u>Sanitaire :</u>	LEGRAND
<u>Ventilation :</u>	BELVENT
<u>Electricité :</u>	HIFLOW
<u>Sprinklage :</u>	IFC
<u>Astrid :</u>	CONNEXT
<u>Ascenseurs :</u>	KONE.

13.4.

PEB

13.5.

ABORDS
