

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 45

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 30/11/2023, de 09h00 à 12h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com	X	X
	MO/COM	Liesbeth GESTELS Frédéric LESIRE Elise HENDRICKX Harold BURNET Nuria GOMEZ FRIAS	E : liesbeth.gestels@belfius.be E : flesire@bpi-realestate.com T : 0497/514.587 E : ehendrickx@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com		X X X X X X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Ludovic BRIARD Ingénieur de projet Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 493 76 84 47 E : ludovic.briard@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be	X Part	X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Anastasia SYMEONIDOU – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	X X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : +32 478 48 39 72 E : apa@tpf.be	X	X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be		X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS Ana AVRAM	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be E : peb.management@tpf.be		X X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be		X
COORD SECURITÉ SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Jeudi 07/12/23 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	OBJET	ACTION	DATE
----	-------	--------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1.

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	404			358
Du 23/11/23 au 30/11/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	411	0	0	351

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1.

06/10/22
30/11/23

Avancement chantier

Général

- Maçonneries non portantes en cours au sous-sol -1
- Pose des canalisations de gaz en cours au plafond du -1.
- Début pose des canalisations de sprinklage

Bloc A :

- Verticaux du +4 fini
- Couvrant +4 en cours

Bloc B :

- Dalle du haut +3 finie
- Début des verticaux du +4

Bloc C :

- Couvrant +3 fini

Bloc D :

- Prédalles du couvrant +3 posées
- Gaines de ventilation posées

Bloc E :

- Couvrant +3 en cours

Bloc F :

- Verticaux +3 en cours

3. DECOMPTES			
3.1. 12/10/23	<u>Adaptations PEB :</u> <i>Suite aux résultats des encodages transmis par PEB, des adaptations sont à prévoir.</i> <i>Voir commentaire point 9.1 Isolation des sous-sols.</i>	MO	
3.2. 02/11/23	<u>Étanchéité des carrelages :</u> <i>Conformément à ce qui a été fait dans le Lot H précédemment, EG avait chiffré l'étanchéité sous les carrelages des SDB (entourage douches et baignoires) mais ce poste n'a pas été retenu dans le bon de commande final. EG recommande fortement de prévoir cette étanchéité. Selon EG, le choix du système d'étanchéité liquide ou via membrane n'a pas d'incidence sur le prix.</i>	MO	
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1. 30/11/23	<u>Remarques faites sur LETSBUILD :</u> <i>Pour qu'elles soient visibles plus facilement par TOUS, AR compilera les remarques vues sur chantier dans le récapitulatif LETSBUILD. Le listing hebdomadaire sera publié chaque semaine en annexe du présent PV.</i>	MO	
4.2. 24/08/23 19/10/23	<u>Luminaire public trop proche d'un balcon, Avenue des Lilas :</u> <i>Le luminaire de la façade Sud a été déplacé d'environ 1,50m vers la gauche. Il faut encore décaler le luminaire de la façade Est.</i>	MO	
4.3. 26/10/23	<u>Blocage des pieds de volée d'escalier au sous-sol :</u> <i>Pour la première volée du SS -1 vers le Rez de l'escalier E, EG doit vérifier la fixation de pied de volée.</i>	EG	
4.4. 23/11/23 30/11/23	<u>Installation des conduites de sprinklage sous-sol :</u> <i>TS demande de vérifier dans les réglementations, si la pose des tuyauteries de sprinklage ne se fait pas trop écartée du plafond. Les têtes de sprinklage doivent se trouver tout près de la surface à protéger.</i> <i>Il y a eu des échanges de mails à ce sujet.</i> <i>TS a demandé à EG de prévoir le passage de l'autorité de contrôle pour approbation de la mise en œuvre.</i>	EG	
4.5. 23/11/23	<u>Installation des conduites de gaz sous-sol :</u> <i>La pose des suspensions de conduites de gaz est en cours dans le couloir des locaux vélos. Les rails de suspension laissent entrevoir que les nappes de tuyaux vont faire toute la largeur du couloir.</i> <i>TS précise qu'il faut pouvoir accéder aux techniques susceptibles de se retrouver au-dessus de la nappe de tuyaux (détecteurs de mouvements) raccordements sanitaires, ...</i> <i>Il faut laisser la place pour passer au-dessus, ou prévoir des potences pivotantes pour permettre de faire l'entretien des têtes de détecteurs de fumée.</i> <i>AR précise également que les éclairages du couloir ne peuvent pas être placés au-dessus de la nappe de tuyaux de gaz pour permettre leur remplacement. Voir aussi ce qu'il en est des clapets coupe-feu qui vont traverser la paroi entre couloir et caves.</i>	EG	
4.6. 30/11/23	<u>Renforcement dans le plafond sas bloc C sous-sol -1 :</u> <i>Dans le hall ascenseur sous-sol -1 du bloc C ; il y a un renforcement.</i> <i>AR demande à TS de vérifier si nécessaire de prévoir des mesures de sécurité (détecteur de fumée, ou autre) dans ce renforcement.</i>	TS	

5. STABILITE

5.1.	<u>Coordination des plans STAB :</u>		
27/09/22			
19/10/23	<u>Acrotères en béton coulé / préfabriqué :</u> EG a fait, sur chantier, un échantillon d'acrotère préfabriqué avec tapis en fond de coffrage. La structure du tapis est légèrement grainée, est la même que la surface marchable du balcon. La teinte du béton a l'air grise, trop foncée. EG précise que cela est dû au fait qu'il a été coulé la veille. MO rappelle qu'il a été question de le peindre. L'option peinture reste envisageable si la teinte de béton des éléments mis en place, une fois complètement séché, ne convient pas à MO.		
26/10/23	Malgré la restriction concernant l'aspect, MO et AR acceptent l'échantillon.		
02/11/23	EG informe que tous les éléments d'acrotères d'un même étage seront réalisés en même temps, avec le camion de béton, afin de garantir l'homogénéité de couleur et de prise.		
16/11/23	SECO remet en question le détail d'exécution car SECO considère que l'allège en béton ne peut pas être considérée comme étanche et préconise d'emballer l'allège avec une membrane d'étanchéité. EG va prendre contact avec SECO pour trouver une solution.		
23/11/23	EG et MO ont une réunion prévue avec SECO le mercredi 29/11/23 où ils discuteront des acrotères et des parements en briques de façades.	STAB EG MO SECO	
30/11/23	Suite à la réunion, SECO maintient que le béton des acrotères n'est pas étanche. SECO demande à minima une peinture hydrofuge sur le béton afin de le rendre étanche. MO et STAB valident la solution. Reste à définir le type de peinture à utiliser.		
5.2.	<u>Espacement des conduites de ventilation</u>		
21/09/23			
19/10/23	SECO a renvoyé une remarque sur Cooperlink disant qu'ils ne sont pas concernés et demandent à STAB de fournir un principe de pose approuvé.		
	STAB va le transmettre à SECO.		
26/10/23	Encore à faire.		
23/11/23	RAPPEL : Encore à faire.		
30/11/23	RAPPEL : Encore à faire par STAB.	STAB	
5.3.	<u>Bordereau de poutres :</u>		
26/10/23	EG demande à STAB un bordereau des poutres de tous les étages restants et des poutres des acrotères pour préfabrication.		
16/11/23	Fait.	EG STAB	
23/11/23	STAB doit encore envoyer les éléments du haut du +5 et +6.		
30/11/23	Fait.		

6. ARCHITECTURE

6.1.	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u>		
12/01/23			
05/10/23	AR a adapté la toiture et attend les plans de EG/TS concernant les cabanons de toiture.	EG/TS AR TS	
23/11/23	EG/TS a déposé son plan sur Cooperlink. AR et TS ont fait leurs remarques.		
30/11/23	Un nouvel indice a été déposé sur COOPERLINK, pour vérification et approbation.		
6.2.	<u>Châssis.</u>		
09/03/23			
16/11/23	PEB a demandé de passer des châssis supplémentaires en triple vitrage pour certains appartements plus défavorables mais EG a déjà commandé tous les profilés, y compris les parclozes plus minces adaptées au double vitrage.		
	EG prévient qu'il faut modifier la division de trois grands châssis dans les séjours afin d'ajouter un renfort. De ce fait, l'imposte supérieure est coupée pour faire passer le renfort coté intérieur. EG a déposé les plans et les détails sur Cooperlink.		
	EG informe que tous les châssis sont équipés d'un cylindre avec clé afin d'empêcher les ouvertures intempestives par les ouvriers lors du chantier.	EG AR PEB	
23/11/23	AR a vérifié les FT déposées par EG sur Cooperlink.		
6.3.	<u>Raccord pied de façade :</u>	ABO AR EG	
05/10/23	Suite à l'ajout du L de soutènement en béton contre la terrasse du bâtiment C, AR doit revoir le raccord de la façade en brique. Il faut prévoir la cassure dans le jardin, due à la différence de niveau entre le bâtiment C et D.		
23/11/23	AR a vérifié la FT de localisation des cornières de support des briques de parement, et remarque que les niveaux de ces cornières basses ne sont pas indiqués. Donc coordination avec le niveau du sol extérieur difficile.		

6.4.	<u>Briques Ecobrick :</u>	
05/10/23		
19/10/23	La note de calcul est en cours chez EG pour les fers à brique et les cornières de support.	
02/11/23	MO souhaite que EG réalise un mock-up pour valider le système de pose des ecobricks. EG va programmer la réalisation du mock-up avec plusieurs appareillages (verticaux, retraits, etc.) et avec les échantillons de joint silicone.	
23/11/23	EG informe que le mock-up arrivera pour la réunion du 7/12.	
	Pour le Rez, AR précise qu'il faut terminer au niveau du linteau avec des briques entières. Etant donné que les châssis sont plus hauts à certains endroits du rez, c'est dans le bas (au niveau du seuil) qu'il faut éventuellement démarrer avec une fraction de brique.	
30/11/23	Suite à la réunion du 29/11/23 entre EG et SECO, un retour de SECO est attendu suite aux remarques concernant les ecobricks.	
	EG précise qu'il est possible de démarrer avec une brique enterrée dans le bas (au niveau du seuil).	EG AR SECO MO
6.5.	<u>Local vélos</u>	
12/10/23		
16/11/23	MO propose d'ouvrir la porte vers l'extérieur, et qu'elle puisse être maintenue grâce à une butée avec rétenteur. MO souhaite que la porte soit munie d'un film translucide pour empêcher la vue vers l'intérieur. AR propose de passer à une porte avec 128cm d'ouverture afin de faciliter le passage des vélos. EG va vérifier avec son fournisseur si cela est possible.	
	Autour de l'escalier D, les blocs de béton passent en 9cm d'épaisseur, mais doivent être RF 1h. Il faudra prévoir plus de murfor puisqu'il y a une grande hauteur sous plafond.	
23/11/23	Pour obturer les deux baies du local vélo, EG propose des blocs de 14 cm alignés avec la face intérieure du local. EG confirme que le décrochement du mur ne pose pas de problème pour la pose de l'isolant. EG pose la question de la finition du local : vu l'hétérogénéité des matériaux des murs (béton, blocs silico-calcaire, blocs de béton) EG demande s'il ne faudrait pas envisager une finition murale pour homogénéiser le tout. EG et MO doivent vérifier ce qui est prévu comme finition pour ce local dans le bon de commande.	
	Voir commentaire point 9.1 Isolation des sous-sols.	AR PEB MO EG
6.6.	<u>Mise à jour des faux plafonds :</u>	
12/10/23	AR vérifie, si nécessaire, la présence des faux plafonds dans les petits locaux au rez-de-chaussée des blocs D-E-F (hauteur libre 340cm). MO propose d'y placer des faux plafonds à environ 270cm.	
19/10/23	Fait chez AR. Tous les faux plafonds non nécessaires sont retirés des plans AR et COM. Seuls quelques cas particuliers où on a des arrêts au milieu d'un linteau de porte ou pour aller jusqu'au bout de la branche d'un couloir en L qui est proche, sont prolongés légèrement. Donc pas de décompte. EG/TS et MO/COM vont se concerter afin de fournir à AR les faux plafonds nécessaires pour adaptation des plans EXE.	
23/11/23	En attente des plans EXE.	
	EG propose de rajouter un faux plafond dans le sas d'entrée du bloc F afin de dévier la décharge sanitaire de la trémie T5F vers la trémie T2F. En effet, il n'y a pas assez de hauteur sous plafond au niveau du sous-sol -1. MO et AR donnent leur accord.	
30/11/23	EG est en attente des plans EXE modifiés. AR doit ajouter le faux plafond du sas d'entrée du bloc F dans ses plans.	AR MO MO/COM EG/TS
6.7.	<u>Saillie poutre au -1 à l'angle du bloc A :</u>	
02/11/23	Il y a une poutre qui déborde de l'alignement de façade au droit du bloc A, à l'angle des façades Ouest et façade intérieure patio. Elle sera complètement emballée dans l'étanchéité. Il faut trouver une solution pour la masquer car elle risque de sortir légèrement de l'alignement fini.	AR EG
16/11/23	La poutre sera emballée dans de l'isolant + étanchéité.	
6.8.	<u>Porte SAS ascenseur sous-sol -1 :</u>	
16/11/23	AR va vérifier avec ASSA ABLOY s'il existe un ferme-porte avec retenue retardée afin de faciliter le passage des vélos. EG contacte également son sous-traitant.	
23/11/23	AR a eu un contact avec ASSA ABLOY qui informe qu'il existe des ferme-porte équipées d'un système de retard à la fermeture qui pourraient convenir.	AR EG
30/11/23	EG approuve cette solution et prendra contact avec son fournisseur lors de la mise au point des bordereaux de portes intérieures.	

6.9. 23/11/23	<u>Position rideau pare-feu :</u> <i>Dans le parking -1, en haut de la rampe allant vers le -2, le rideau pare-feu doit être déplacé hors de la zone de passage des tuyaux de gaz sous le plafond. Il sera reculé dans la pente de la rampe. OK de AR et MO sur ce point.</i>	EG AR MO
7. GESTION ACQUEREURS		
7.1. 22/06/23 14/09/23 05/10/23 26/10/23 16/11/23 23/11/23 30/11/23	<u>Plan techniques DESCO et CUISINES :</u> <i>Contrairement à ce qui a été évoqué précédemment, MO confirme qu'on place bien toutes les cuisines dans les appartements invendus MO/COMM a reçu l'offre de base et attend les plans techniques MO/COMM informe que les délais de fourniture pour les plans techniques seront plus longs étant donné le déménagement des bureaux du cuisiniste. Le retard des cuisines est en cours de résorption et l'upgrade des appartements est en cours de mise à jour. Pour trois appartements, il faudra décaler la porte du séjour de 10cm pour donner plus de place dans la cuisine. L'interrupteur de l'entrée du séjour doit être intégré dans le plan cuisine car il y a un risque de conflit entre interrupteur et crédence. AR doit adapter ses plans. MO/COMM est occupé à finaliser les plans techniques. AR a adapté ses plans. MO/COMM est occupé à finaliser les plans techniques.</i>	AR EG MO/COMM
7.2. 07/09/23 05/10/23 02/11/23 23/11/23 30/11/23	<u>Devis EG pour les modifications acquéreurs :</u> <i>MO/COMM demande quand EG pourra répondre aux demandes de prix pour les modifications acquéreurs. EG précise qu'il devrait être en mesure de faire le chiffrage des demandes acquéreurs à partir d'octobre. MO/COMM va envoyer les devis acquéreur à EG. EG demande à MO de fournir la shopping list des prix des suppléments. EG a reçu plusieurs Shopping Lists avec des prix différents. MO précise à EG quelle est la shopping list à suivre pour ce projet-ci. La Shopping List a été passée en revue en réunion. MO va mettre à jour la Shopping List et EG met à jour son tableau de calcul des suppléments acquéreur.</i>	EG MO/COMM MO
7.3. 07/09/23 16/11/23 23/11/23	<u>Remplacement des bains par des douches :</u> <i>EG/TS s'est entretenu avec son fournisseur. il en ressort que la plupart des bains pourront être remplacés par des douches, conformément aux demandes de MO/COMM. EG/TS transmettra ses plans EXE et se concertera avec MO/COMM à propos des cas qui posent problème. EG/TS a validé tous les changements et a transmis à MO/COMM.</i>	EG EG/TS MO/COMM
7.4. 05/10/23 26/10/23 02/11/23 23/11/23	<u>Carrelage :</u> <i>EG souhaite qu'une réunion avec QUADRUS soit organisée pour la mise au point des détails de fourniture des différents revêtements. La réunion avec EG et QUADRUS est prévue pour le vendredi 27/10/23. Concernant le carrelage des salles de bain/douche des blocs D-E-F (grande hauteur), si le faux plafond se situe en dessous de 250 cm, le carrelage est posé sur toute la hauteur. Si le faux plafond se situe au-dessus de 250cm, le carrelage est posé à hauteur de porte avec un module entier et le carrelage coupé se trouve au niveau du sol. La réunion a eu lieu. QUADRUS a précisé qu'il y a eu une restructuration des équipes et que les problèmes d'approvisionnement passés ne se reproduiront plus. MO/COMM et EG vont faire venir les échantillons de carrelages pour le choix des couleurs dans les parties communes.</i>	EG MO/COMM
7.5. 12/10/23 30/11/23	<u>Changement et upgrade de certaines cuisines :</u> <i>MO/COMM modifie ses plans et informera AR pour adaptation des plans COM. MO/COMM intégrera les modifications des cuisines sous 2 à 3 semaines et les transmettra à AR pour MAJ des plans ARCHI.</i>	AR MO/COMM
7.6. 23/11/23 30/11/23	<u>Position des chaudières et double-flux :</u> <i>La position des chaudières et des groupes double-flux a changé. EG/TS doit préciser à MO/COMM quels appartements sont concernés par la modification pour adapter les plans COMM et les plans AR. EG/TS va transmettre les plans coordonnés avec la position des chaudières et groupes double-flux, surtout pour ce qui concerne les modifications d'implantation des chaudières et groupes double flux par rapport aux plans AR et COMM</i>	EG/TS AR MO/COMM

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

8.1. 27/04/23 23/11/23	Prochaine réunion TS : Prochaine réunion TS en présence de TS et EG/TS le jeudi 07/12/23	TS EG/TS	07/12/23
8.2. 27/09/22 26/10/23 02/11/23 23/11/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants - SIBELGA :</u> <u>Cabine HT :</u> EG doit faire une proposition de plan d'aménagement de la cabine, à soumettre à SIBELGA pour approbation, malgré le fait qu'on soit en présence d'une cabine client. EG/TS doit centraliser les informations afin de transmettre à SIBELGA les documents demandés. EG/TS a transmis les informations à SIBELGA. MO va prendre contact avec SIBELGA.	MO EG/TS	
8.3. 26/10/23 23/11/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants - SIBELGA - Gaz :</u> Pour le Gaz, on prévoit une cloison à 80cm des pieux, en laissant un passage du côté de l'angle du bâtiment. SIBELGA précise que normalement, sur cette longueur de mur, on devrait pouvoir y mettre tous les compteurs, et il y a possibilité d'en prévoir quelques-uns sur le retour de mur côté ascenseur B. Ne pas oublier de prolonger les ventilations hautes et basses en fonction de cette paroi rajoutée. Fait. AR a mis son plan du local gaz à jour.	EG/TS AR	
8.4. 17/08/23 31/08/23 12/10/23 02/11/23 16/11/23 23/11/23	<u>Gestion partie « publique » du parking :</u> EG précise que le fournisseur du système décrit en base n'est pas encore désigné. AR précise qu'il faut étendre le système de gestion de la partie publique du parking aux accès à ce parking (escalier A et ascenseur vélos). Ces 2 accès doivent également recevoir un système de contrôle permettant une certaine restriction d'accès. Sur question de EG, MO précise qu'il n'a pas encore su avancer sur le mode de gestion des accès au parking semi-public. EG va organiser une réunion avec un sous-traitant potentiel afin de présenter à MO les possibilités de contrôle d'accès. MO demande de rajouter au-dessus de la porte concernée l'affichage « Sortie vers Place des Tulipes » dans les deux langues. MO a envoyé un mail avec une proposition de gestion des accès public/privé. MO et EG ont réunion avec le fournisseur du système de barrières et contrôle d'accès ce 16/11/23 après-midi. Le fournisseur propose un système de reconnaissance de plaque avec caméra (validation chez un commerçant ou paiement via la plateforme en ligne). Pour l'accès aux ascenseurs, le fournisseur propose un clavier alphanumérique afin d'insérer le numéro de la plaque d'immatriculation. MO attend un retour de prix ainsi que la faisabilité de ce clavier. MO précise qu'on garderait la porte sectionnelle ainsi que la barrière du parking.	EG MO	
8.5. 28/09/23 26/10/23	<u>Entrée des impétrants - VIVAQUA :</u> Suite contacts avec les responsables de VIVAQUA, EG/TS précise qu'il faut compter 1 mois entre la confirmation de commande et l'intervention sur site pour l'introduction de la conduite d'eau dans le bâtiment.	EG	
8.6. 28/09/23 26/10/23 23/11/23	<u>Entrée des impétrants - PROXIMUS :</u> Ni MO, ni EG n'ont de nouvelles de PROXIMUS. MO a reçu les informations de EG. MO doit envoyer la demande.	MO	
8.7. 05/10/23 26/10/23 02/11/23 23/11/23	<u>Raccordement eaux usées/eaux pluviales à l'égouttage public :</u> MO a donné une mission externe au bureau HCO afin de recalculer les eaux. Une réunion a été tenue en TEAMS le 03/10/23. MO n'a pas encore de retour de HCO. MO a eu un contact avec HCO lundi 30/10/23, qui l'a informé qu'il transmettrait ses calculs pour le vendredi 03/11/23. HCO a envoyé ses calculs. MO doit les consulter et prendre contact.	MO HCO	

8.8. 12/10/23	<u>Gestion des bornes de recharge voitures électriques :</u> La localisation des armoires de gestion des bornes de recharge voitures doit encore être finalisée. Les équipements sont actuellement prévus dans le local surpresseur, contre la façade. Mais comme on supprime le contre-mur devant les pieux, il faut vérifier ou on place les armoires et équipement du gestionnaire des bornes électriques.		
02/11/23 23/11/23	Il faut les maintenir le plus près possible de la cabine HT. MO informe qu'il n'y aura pas de borne après la porte sectionnelle. Les bornes se trouvant avant la porte sectionnelle sont encore sujettes à discussion. MO doit également décider ce qu'il en est du chemin de câble, du tableau électrique et du bouton pompier.	MO	
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.9. 27/04/23 26/10/23	<u>Cabine haute tension :</u> TS précise qu'il faut prévoir un système de réarmement automatique en cas de coupure de courant réseau, pour éviter les coupures de courant trop longues dans les parties communes de l'immeuble.	TS EG	
23/11/23	EG est entrain de faire la demande de prix ;		
8.10. 31/08/23	<u>Alimentation électrique des appartements :</u> TS précise qu'en vérifiant les FT et plans d'exécution sur COOPERLINK, il a remarqué que certains appartements sont alimentés en triphasé alors que l'installation est en monophasé. EG/TS précise que c'est prévu pour permettre une modification ultérieure sans devoir tout recâbler. TS demande aussi à EG/TS de transmettre les notes de calcul des alimentations des appartements depuis les compteurs privatifs, pour vérifier la pertinence des raccordements en 10² et/ou en 16².		
28/09/23 23/11/23	Calculs encore à fournir par EG/TS. Encore à faire.	EG/TS	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.11. 26/05/23 17/08/23	<u>Implantation des équipements locaux compteurs.</u> Modification des sens et positions des portes encore à mettre à jour sur les plans AR. Encore à mettre à jour chez AR. Suppression du contre-mur aussi à prévoir dans les locaux compteur eau / local surpresseur et local transfo d'isolement. Tous les équipements présents sur cette cloison sont placés sur le mur côté parking. Mis à jour chez AR et en attente de confirmation par EG/TS + SIBELGA.		
12/10/23 23/11/23	Point d'attention : Ne pas oublier que la FT des surpresseurs sprinklage doit être validée par VIVAQUA.	EG/TS AR	
8.12. 21/09/23	<u>Raccordement égouttage public</u> Le raccordement à l'égouttage public ne pourra pas se faire au niveau de la cave n°13 située au sous-sol -1. Le passage des pieux devra être déplacé et EG va faire un relevé des raccordements.		
23/11/23	Sur question de AR, MO confirme que 2m10 de hauteur libre sous tuyaux d'égouttage est suffisant dans les caves. Sur question de AR, EG et TS précisent que, pour le raccordement de l'eau usée au réseau public, les siphons disconnecteurs ne sont plus nécessaires.	AR EG TS MO	
8.13. 12/10/23	<u>Raccordement aux trémies d'appartements :</u> Suite à des échanges de mail, EG/TS et TS ont vérifié leurs calculs respectifs. Sur base des principes de TS, EG/TS va étudier ce qui peut être amélioré et mettre à jour les plans EXE.	EG/TS TS	
8.14. 16/11/23	<u>Déplacement des collecteurs :</u> Dans certains appartements, TS précise que certaines longueurs de tuyauterie entre la chaudière et le point de collecte sont trop longues et suggère de déplacer les collecteurs. EG/TS a transmis une note de calcul montrant que l'avantage est minime. De surcroît, la présence des collecteurs dans les locaux buanderie présente un gros risque de conflit avec la pose de la machine à laver.		
23/11/23	MO confirme qu'on ne déplace pas les collecteurs.	EG/TS TS MO	

TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC

TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION

8.15. 21/09/23	<u>Gestion d'humidité/condensation</u> MO précise que le problème de condensation survient principalement lorsqu'il fait chaud à l'extérieur. L'air est donc souvent chargé de plus d'humidité. Dans ce cas, lorsque cet air extérieur chaud et humide est injecté dans les caves qui sont fraîches, il y a beaucoup de condensation qui se dépose sur les parois. TS précise qu'une solution peu onéreuse serait de rajouter des hygrostats sur les gaines d'entrée d'air frais des circuits de ventilation des locaux sous-sols. Ces hygrostats permettront de diminuer la vitesse, voire d'arrêter les groupes de ventilation pendant les périodes de taux d'humidité dans l'air, élevé.		
23/11/23	TS préconise de mettre la sonde hygrométrique dans les gaines qui mènent aux caves plutôt qu'à l'extérieur dans le jardin.	TOUS	
8.16. 23/11/23	<u>Continuité ventilation parking SS -1 :</u> TS précise qu'il faut conserver un passage d'air (20.000 m³/h) au travers de la porte sectionnelle qui sépare la partie privée de la partie publique du parking. 3 solutions possibles : 1) Partie grillagée dans la porte sectionnelle 2) Espace libre au dessus de la porte sectionnelle 3) Remplacement du mur entre les places de parking 15 et 16 par une cloison grillagée EG fera une proposition.	EG TS MO	

TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS

8.17.	<u>Vérification des plans d'exécution :</u>		
31/08/23			
21/09/23	Représentant KONE présent à la réunion. KONE va mettre à jour ses documents pour validation suite aux remarques de TS, AR et EG. AR doit transmettre à KONE le sens d'ouverture des portes d'ascenseur afin que KONE définisse la position des BlueKits (dimension minimale 57 x 45 cm). KONE transmettra également un prix pour la finition stratifié des parois latérales. AR doit transmettre le sens d'ouverture des portes d'ascenseur à KONE <u>Finitions cabines :</u>		
21/09/23	Ascenseur vélos : inox 3.16. (Résistant aux intempéries) pour toutes les faces Ascenseur de personnes : inox pour les portes des ascenseurs A ->F et stratifié chêne clair pour les parois latérales. Tous les ascenseurs : réservation sol de 23 mm pour carrelage.		
19/10/23	EG/TS précise qu'il n'a pas encore eu de retour de l'ascensoriste suite aux remarques faites en réunion.		
16/11/23	Le supplément pour la finition stratifié chêne est refusé par MO. Les ascenseurs, décrits en base avec inox pour l'intérieur de la cabine, sont maintenus. AR valide.		
23/11/23	Les FT corrigées ont été déposées sur Cooperlink pour vérification et approbation.		
		EG/TS MO AR	RAPPEL

9. CONSEILLER PEB

9.1.	<u>Isolation des sous-sols :</u>		
14/09/23	EG a proposé de remplacer une partie des isolants du sous-sol (plafonds) par du MULTIPOR au lieu de la laine minérale / Heraklith prévus initialement. Le MULTIPOR est en effet moins sensible à l'humidité ; ce qui permet de démarrer les travaux de pose de cet isolant plus tôt pour améliorer les plannings de pose des techniques (surtout conduites gaz) au plafond du sous-sol. AR ne voit pas de contre-indication.	EG	
21/09/23	Retour de PEB demandé sur cette proposition de variante. MO propose de préparer un listing de questions précises pour PEB à transmettre pour lundi 25/09/23 afin de préparer la réunion du jeudi 28/09/23 (isolation des façades, isolation sous-sol, châssis). Une question concernera notamment la façade latérale orientée SO dont l'héraklith passe de 22.5 à 25cm.		
28/09/23	Réunion reportée d'une semaine. PEB sera présent à la réunion du 05/10/23	PEB	05/10/23
05/10/23	PEB valide les 25 cm de laine minérale pour la façade latérale orientée SO. PEB va envoyer un croquis pour compréhension. Concernant la rampe de parking, AR doit corriger la coupe erronée où il manque l'isolation Tektalan au plafond. PEB va faire des encodages et simulations afin de renvoyer les conclusions pour décision. A propos de l'isolation trémies ascenseur et trémies techniques en toiture, PEB confirme qu'il faut une valeur $u = 0.024$. Pour les parois verticales, PEB propose un isolant PUR de 10 cm ou LM de 14 cm. Pour les parois horizontales, PEB préconise une épaisseur de 30cm de PUR.		

12/10/23	PEB a reçu et encodé les FTE châssis et vitrage. Il en ressort qu'il faut améliorer les performances des châssis de 6 appartements. EG a questionné son fournisseur sur la possibilité d'ajouter des isolants complémentaires dans les profilés. EG propose de remplacer localement l'isolation des façades par du PUR à la place de la LM. PEB informe que cela fonctionne avec 22 cm d'isolant PUR sauf pour l'appartement A0A pour lequel il faudrait une isolation complémentaire au plancher : NESTAAN 20 cm de PUR projeté par couche de 3 à 4cm. PEB doit confirmer l'ensemble après encodage.	
26/10/23	PEB a envoyé les conclusions suite à l'encodage. EG a transmis une FT de profilés de châssis amélioré afin que PEB encode les nouvelles valeurs. EG souhaite que PEB soit présent à la prochaine réunion le 19/10/23.	
02/11/23	Souhait de EG de voir PEB à la réunion de chantier du 02/11/23. EG demande de fixer un rdv visio avec PEB pour la semaine 46.	
10. COORDINATION SECURITE-SANTE		
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS
10.1.	<u>Présence de CSS aux réunions de chantier :</u>	
26/10/23	MO précise qu'il faut organiser des réunions régulières de la cellule de coordination, en présence de tous les bureaux d'études et de l'entreprise. MO contacte CSS afin d'organiser de telles réunions régulièrement.	MO CSS
11. ACOUSTIQUE		
11.1.	<u>Approbation des FT :</u>	
26/10/23	EG rappelle qu'AC doit approuver les FT qui la concerne sur Cooperlink. EG contacte AC pour mise à jour.	EG AC
12. ABORDS		
12.1.	<u>Terrasse appartement D.0.A :</u>	
06/07/23	ABO doit encore faire la mise à jour de son plan d'aménagement pour rajouter la terrasse de l'appt D.0.A.	ABO
14/09/23	Solution pour aménagement de cette terrasse encore à mettre au point chez ABO.	
12.2.	<u>Récolte des eaux du couvrant parking intérieur d'ilot :</u>	
17/08/23	ABO a transmis les quantités d'eau de pluie qui sont à récolter pour l'espace du patio.	ABO
28/09/23	Il faut vérifier comment la récolte de ces eaux de pluie se répartit dans les raccordements existants ou non. Normalement, pour le permis d'environnement, des quantités d'eau de pluie ont aussi été définies. On peut vérifier les chiffres donnés pour comparaison.	ABO
12.3.	<u>Aménagement patio central :</u>	
14/09/23	MO demande à ABO de faire des propositions de variantes pour réduire les coûts des bancs et tables, ainsi que les coûts des bordures en acier corten délimitant les zones de gravier.	
23/11/23	Le plan mis à jour a été transmis par mail.	ABO
12.4.	<u>Encombrement poutre au -1 à l'angle du bloc A :</u>	
16/11/23	En fonction de l'encombrement de la poutre emballée, il faudra vérifier qu'il n'y a pas de modifications des abords pour le chemin de gravier périphérique. Voir point 6.7- Saillie poutre au -1 à l'angle du bloc A	ABO
13. POINTS POUR MEMOIRE		
	ARCHITECTURE	
13.1.	<u>Parement façade :</u> Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771	


<


ERAS - Remarques AR Visites chantier - N°1 - 30-11-23

Projet : Erasmus Garden lot I

Adresse Chantier : - Anderlecht, Belgique

Nr	Sujet
1.01	Défaut coulage du béton dans le pre-mur dans l'embrasement de la baie
1.02	Avaloir sol parking -2
1.03	Poutre PR17 (couvrant +3) pied façade Nord 4e étage bloc D&E

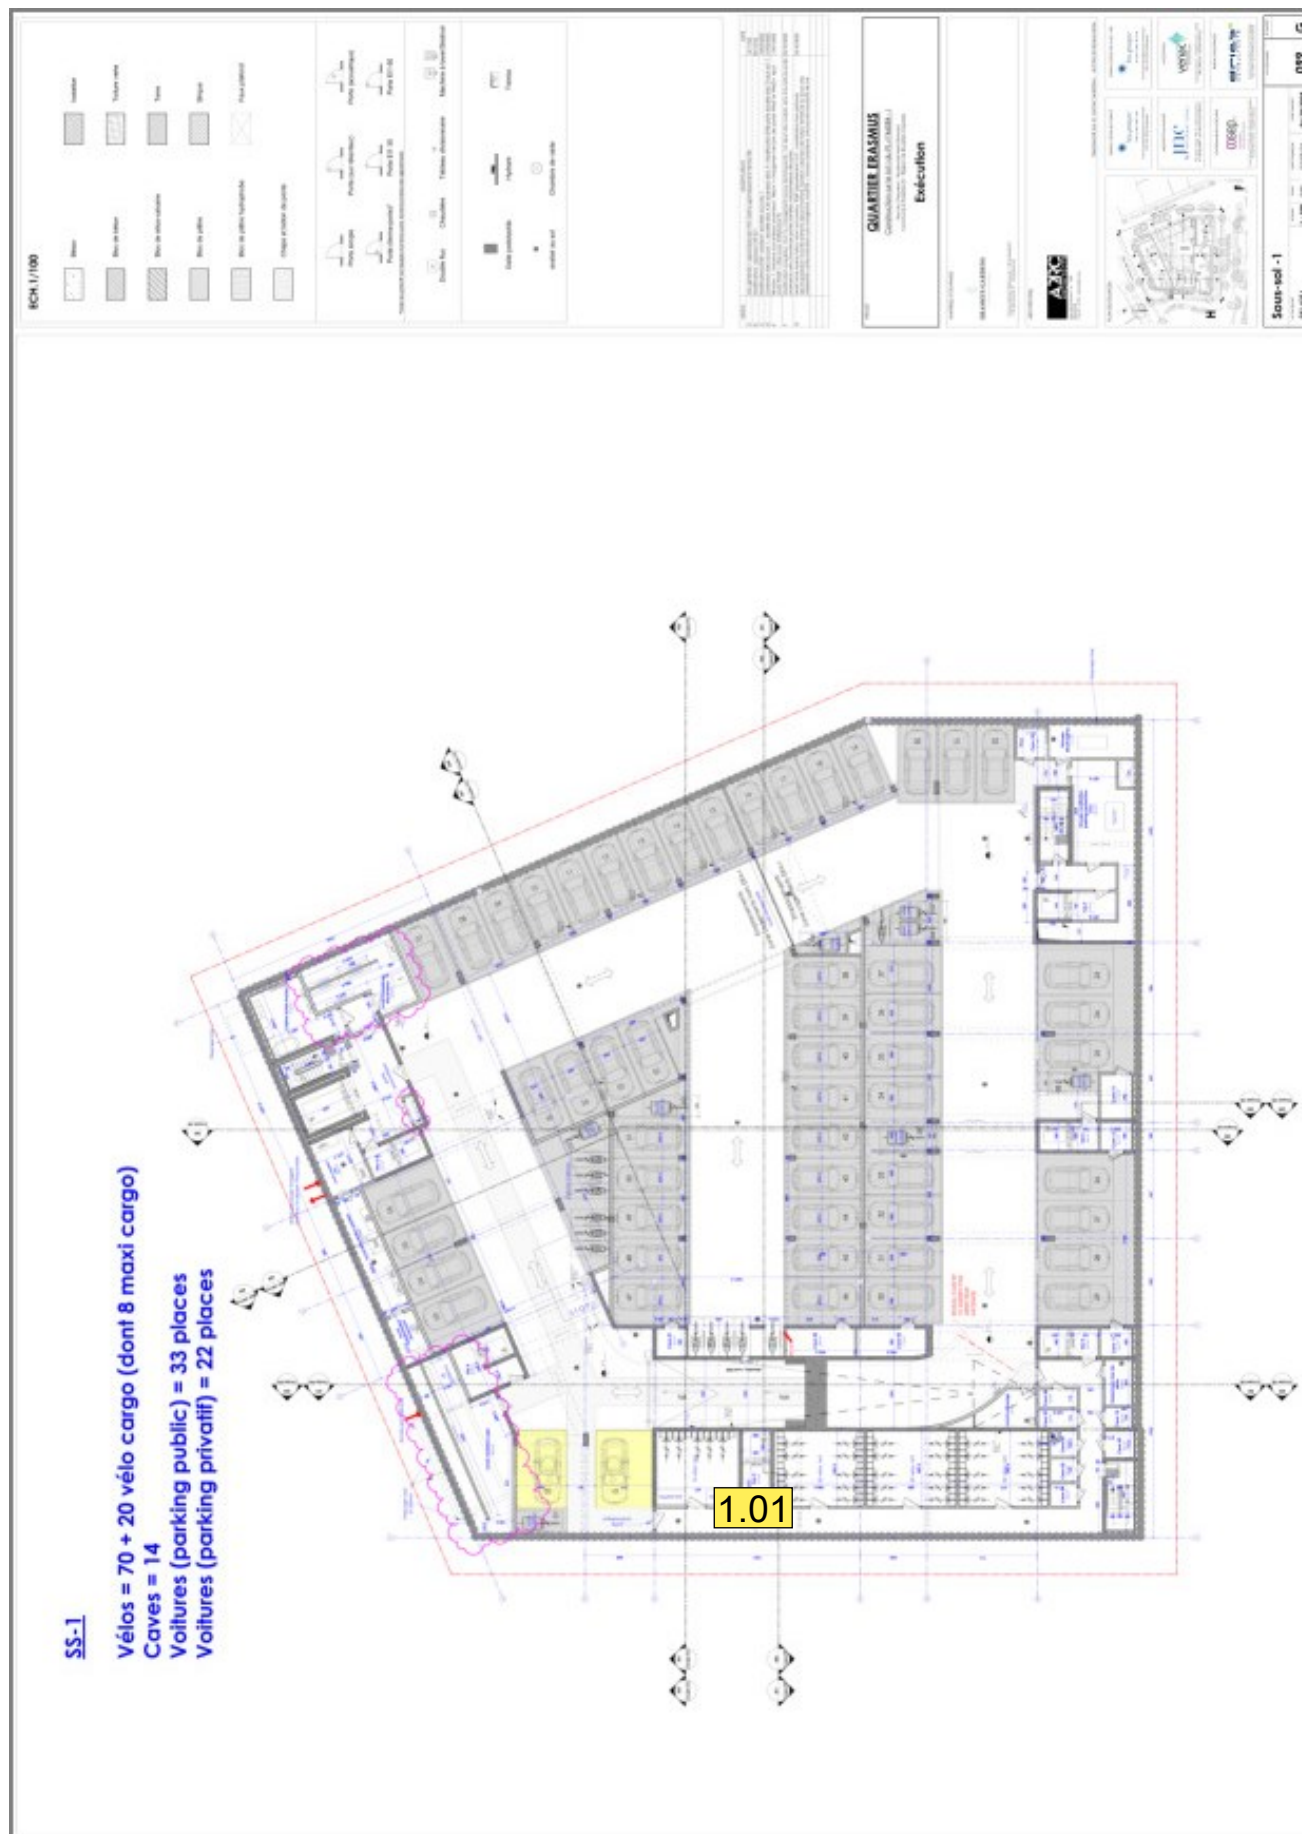

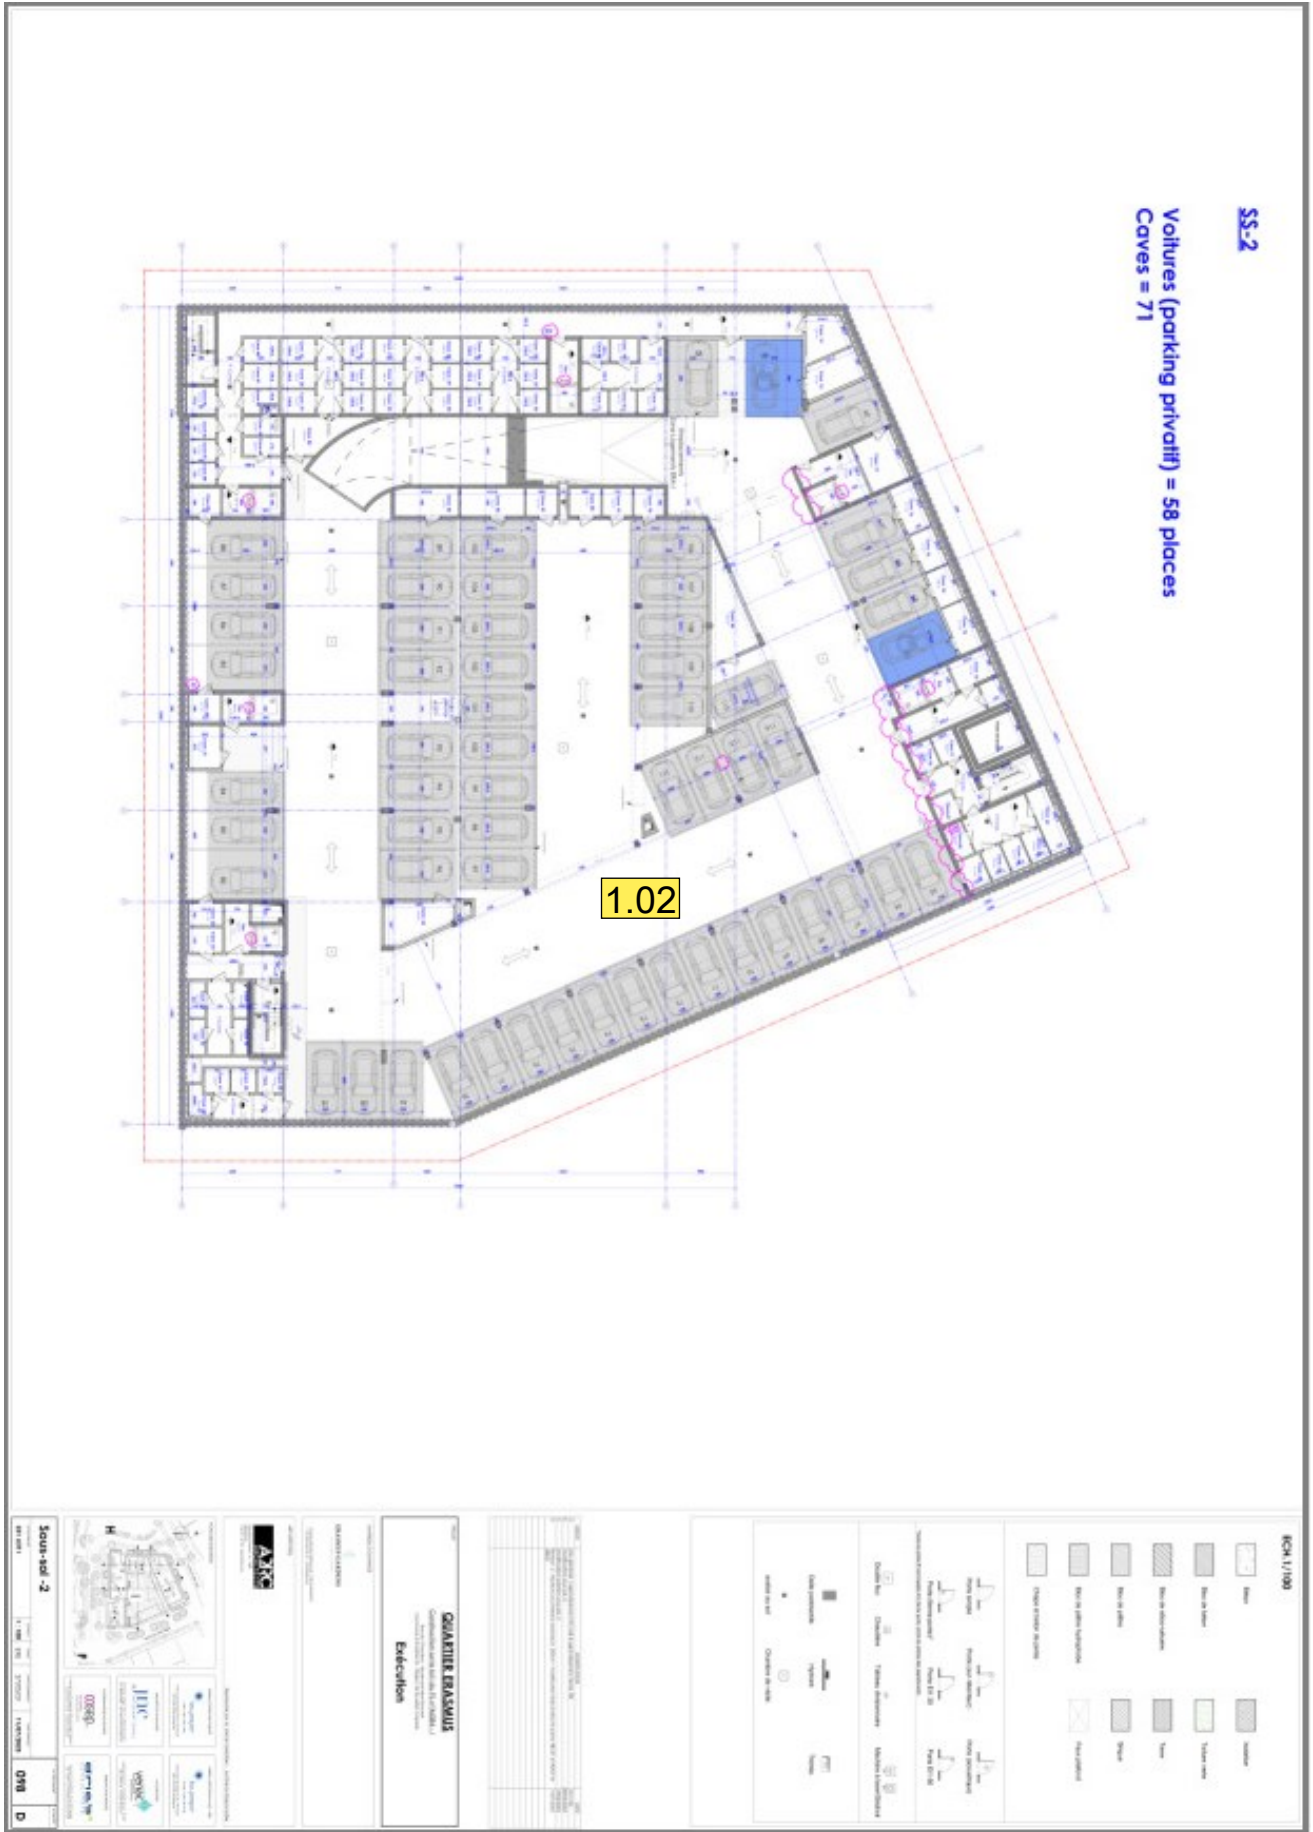

1.01 Auteur: **jc degroote**
Titre: Défaut coulage du béton dans le pre-mur dans l'embrasement de la baie
Liste: Remarques AR Visites chantier
Statut: **Nouvelle Remarque**
Sous-catégorie: 3 Gros Oeuvre / 3.4 Bétonnage
En charge: Morgan Vlamings
Localisation: Mur

Défaut coulage du béton dans le pre-mur dans l'embrasement de la baie



099_G



20231130_100707

1.02 Auteur: **jc degroote**
Titre: Avaloir sol parking -2
Liste: Remarques AR Visites chantier
Statut: **Nouvelle Remarque**
Sous-catégorie: 5 Techniques Spéciales / 5.3 Sanitaire
En charge: Natalia Sanchiz; BPC; BPC GROUP
Date d'échéance: 02-05-23
Localisation: Sol

Avaloir sol parking -2

1.02 - jc degroote

Les 2 avaloirs positionnés ne semblent pas être conformes. Il fait prévoir des avaloir à double niveau dentree



098_D



Photo avr. 28, 2023,
12:36

1.03 Auteur: **jc degroote**
Titre: Poutre PR17 (couvrant +3) pied façade Nord 4e étage bloc D&E
Liste: Remarques AR Visites chantier
Statut: **Nouvelle Remarque**
Sous-catégorie: 3 Gros Oeuvre / 3.3 Ferrailage
En charge: Krzysztof.stankowski; Morgan Vlamings
Localisation: Sol
Important: Oui

Poutre PR17 (couvrant +3) pied façade Nord 4e étage bloc D&E

1.03 - jc degroote

Les barres longitudinales supérieures ne sont pas présentes



20231130_102045



20231130_102103
