

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 47

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 14/12/2023, de 09h00 à 12h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Frédéric LESIRE Elise HENDRICKX Harold BURNET	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : flesire@bpi-realestate.com T : 0497/514.587 E : ehendrickx@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	X	X X X X X X
	MO/COM	Nuria GOMEZ FRIAS		X	X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Ludovic BRIARD Ingénieur de projet Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 493 76 84 47 E : ludovic.briard@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be	X	X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Anastasia SYMEONIDOU – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	X X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : +32 478 48 39 72 E : apa@tpf.be	X	X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be		X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS Ana AVRAM	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be E : peb.management@tpf.be		X X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be		X
COORD SECURITÉ SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Vendredi 12/01/24 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	OBJET	ACTION	DATE
1.	GENERALITES - ADMINISTRATION		
1.1.	Prochaine réunion :		
14/12/23	La prochaine réunion se tiendra le vendredi 12/01/24.	TOUS	
2.	PLANNING		

Date contractuelle début de chantier : 15/10/2022

Délai contractuel de base : 762 jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	--------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	418			344
Du 07/12/23 au 14/12/23 exclu		7			7
Situation en date du P V	762	425	0	0	337

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1.	Avancement chantier		
06/10/22	Général		
14/12/23	- Maçonneries non portantes en cours au sous-sol -1 - Pose des canalisations de gaz en cours au plafond du -1. - Pose des canalisations de sprinklage en cours au -1 - Pose de l'isolant MULTIPOR au plafond du -1 en cours - Début pose des colonnes verticales de décharges E.U. - Premiers châssis posés sur chantier, sans vitrage.		
	Bloc A :		
	- Verticaux du +5 finis - Début couvrant +5		
	Bloc B :		
	Verticaux du +5 en cours		
	Bloc C :		
	Couvrant +4 en cours		
	Bloc D :		
	- Verticaux +4 en cours - Gaines de ventilation posées		
	Bloc E :		
	Couvrant +3 finis		
	Bloc F :		
	Couvrant +3 en cours		

3. DECOMPTES			
3.1. 12/10/23	<u>Adaptations PEB :</u> Suite aux résultats des encodages transmis par PEB, des adaptations sont à prévoir. Voir commentaire point 9.2 Isolation des sous-sols.	MO	
3.2. 02/11/23	<u>Étanchéité des carrelages :</u> Conformément à ce qui a été fait dans le Lot H précédemment, EG avait chiffré l'étanchéité sous les carrelages des SDB (entourage douches et baignoires) mais ce poste n'a pas été retenu dans le bon de commande final. EG recommande fortement de prévoir cette étanchéité. Selon EG, le choix du système d'étanchéité liquide ou via membrane n'a pas d'incidence sur le prix.	MO	
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1.	<u>Remarques faites sur LETSBUILD :</u> Remarques faites sur chantier : Voir listing des remarques sur la plateforme LETSBUILD + Listing récapitulatif des remarques de la semaine en annexe du présent PV.	MO	
4.2. 24/08/23 19/10/23	<u>Luminaire public trop proche d'un balcon, Avenue des Lilas :</u> Le luminaire de la façade Sud a été déplacé d'environ 1,50m vers la gauche. Il faut encore décaler le luminaire de la façade Est.	MO	
4.3. 26/10/23	<u>Blocage des pieds de volée d'escalier au sous-sol :</u> Pour la première volée du SS -1 vers le Rez de l'escalier E, EG doit vérifier la fixation de pied de volée.	EG	
4.4. 23/11/23 30/11/23 07/12/23	<u>Installation des conduites de sprinklage sous-sol :</u> TS demande de vérifier dans les réglementations, si la pose des tuyauteries de sprinklage ne se fait pas trop écartée du plafond. Les têtes de sprinklage doivent se trouver tout près de la surface à protéger. Il y a eu des échanges de mails à ce sujet. TS a demandé à EG de prévoir le passage de l'autorité de contrôle pour approbation de la mise en œuvre. Les plans ont été approuvés par l'organisme de contrôle. Donc OK pour TS.	EG	
4.5. 23/11/23	<u>Installation des conduites de gaz sous-sol :</u> Il faut laisser la place pour passer au-dessus, ou prévoir des potences pivotantes pour permettre de faire l'entretien des têtes de détecteurs de fumée. AR précise également que les éclairages du couloir ne peuvent pas être placés au-dessus de la nappe de tuyaux de gaz pour permettre leur remplacement. Voir aussi ce qu'il en est des clapets coupe-feu qui vont traverser la paroi entre couloir et caves.	EG	
4.6. 30/11/23 07/12/23	<u>Renforcement dans le plafond sas bloc C sous-sol -1 :</u> Dans le hall ascenseur sous-sol -1 du bloc C ; il y a un renforcement. AR demande à TS de vérifier si nécessaire de prévoir des mesures de sécurité (détecteur de fumée, ou autre) dans ce renforcement. TS précise qu'on peut mettre le détecteur de fumée du local dans ce renforcement.	AR TS	
5. STABILITE			
5.1. 27/09/22 19/10/23 30/11/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> <u>Acrotères en béton coulé / préfabriqué :</u> Suite à la réunion, SECO maintient que le béton des acrotères n'est pas étanche. SECO demande à minima une peinture hydrofuge sur le béton afin de le rendre étanche. MO et STAB valident la solution. Reste à définir le type de peinture à utiliser.	STAB EG MO SECO	
5.2. 21/09/23 19/10/23 26/10/23 23/11/23	<u>Espacement des conduites de ventilation</u> STAB va le transmettre à SECO. Encore à faire. RAPPEL : Encore à faire.		

30/11/23 14/12/23	RAPPEL : Encore à faire par STAB. OK fait.	STAB	RAPPEL
----------------------	---	------	--------

6. ARCHITECTURE

6.1. 12/01/23 30/11/23 07/12/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> Un nouvel indice a été déposé sur COOPERLINK, pour vérification et approbation. AR doit encore faire la MAJ de son plan.	EG/TS AR TS	
6.2. 09/03/23 16/11/23	<u>Châssis.</u> PEB a demandé de passer des châssis supplémentaires en triple vitrage pour certains appartements plus défavorables mais EG a déjà commandé tous les profilés, y compris les parclozes plus minces adaptées au double vitrage. EG prévient qu'il faut modifier la division de trois grands châssis dans les séjours afin d'ajouter un renfort. De ce fait, l'imposte supérieure est coupée pour faire passer le renfort coté intérieur. EG a déposé les plans et les détails sur Cooperlink. EG informe que tous les châssis sont équipés d'un cylindre avec clé afin d'empêcher les ouvertures intempêtes par les ouvriers lors du chantier. AR a vérifié les FT déposées par EG sur Cooperlink.	EG AR PEB	
23/11/23 14/12/23	Les premiers châssis ont été posés. SECO vient valider les principes de pose fin de semaine.		
6.3. 05/10/23	<u>Raccord pied de façade :</u> Suite à l'ajout du L de soutènement en béton contre la terrasse du bâtiment C, AR doit revoir le raccord de la façade en brique. Il faut prévoir la cassure dans le jardin, due à la différence de niveau entre le bâtiment C et D.	ABO AR EG	
23/11/23	AR a vérifié la FT de localisation des cornières de support des briques de parement, et remarque que les niveaux de ces cornières basses ne sont pas indiqués. Donc coordination avec le niveau du sol extérieur difficile.		
6.4. 05/10/23 30/11/23 07/12/23	<u>Briques Ecobrick :</u> Suite à la réunion du 29/11/23 entre EG et SECO, un retour de SECO est attendu suite aux remarques concernant les Ecobrick. SECO a donné son accord sur l'utilisation des ECOBRICK, mais reste toujours sur sa position de refus pour ce qui est des appareillages de maçonnerie en briques verticales.	EG AR SECO MO	
6.5. 12/10/23 23/11/23	<u>Local vélos :</u> Pour obturer les deux baies du local vélo, EG propose des blocs de 14 cm alignés avec la face intérieure du local. EG confirme que le décrochement du mur ne pose pas de problème pour la pose de l'isolant. EG pose la question de la finition du local : vu l'hétérogénéité des matériaux des murs (béton, blocs silico-calcaire, blocs de béton) EG demande s'il ne faudrait pas envisager une finition murale pour homogénéiser le tout. EG et MO doivent vérifier ce qui est prévu comme finition pour ce local dans le bon de commande.	MO EG	
6.6. 12/10/23 23/11/23 30/11/23	<u>Mise à jour des faux plafonds :</u> EG propose de rajouter un faux plafond dans le sas d'entrée du bloc F afin de dévier la décharge sanitaire de la trémie T5F vers la trémie T2F. En effet, il n'y a pas assez de hauteur sous plafond au niveau du sous-sol -1. MO et AR donnent leur accord. EG est en attente des plans EXE modifiés. AR doit ajouter le faux plafond du sas d'entrée du bloc F dans ses plans.	AR MO MO/COMM EG/TS	
6.7. 02/11/23 16/11/23	<u>Saillie poutre au -1 à l'angle du bloc A :</u> Il y a une poutre qui déborde de l'alignement de façade au droit du bloc A, à l'angle des façades Ouest et façade intérieure patio. Elle sera complètement emballée dans l'étanchéité. Il faut trouver une solution pour la masquer car elle risque de sortir légèrement de l'alignement fini. La poutre sera emballée dans de l'isolant + étanchéité.	AR EG	
6.8. 14/12/23	<u>Carrelage communs :</u> Les échantillons de carrelage reçus sont de teinte grise. AR et MO demandent à EG de fournir des échantillons plus clairs (teinte tirant sur le beige) pour assortir aux entre-portes.	AR MO EG	

6.9.	<u>Porte SAS ascenseur sous-sol -1 :</u>	
16/11/23		
23/11/23	AR a eu un contact avec ASSA ABLOY qui informe qu'il existe des ferme-porte équipées d'un système de retard à la fermeture qui pourraient convenir.	
30/11/23	EG approuve cette solution et prendra contact avec son fournisseur lors de la mise au point des bordereaux de portes intérieures.	EG
6.10.	<u>Numéros de police :</u>	
14/12/23	MO transmet à AR les plans numérotés pour intégration des numéros de police dans les plans AR.	MO AR

7. GESTION ACQUEREURS

7.1.	<u>Plan techniques DESCO et CUISINES :</u>	
22/06/23		
16/11/23	Pour trois appartements, il faudra décaler la porte du séjour de 10cm pour donner plus de place dans la cuisine. L'interrupteur de l'entrée du séjour doit être intégré dans le plan cuisine car il y a un risque de conflit entre interrupteur et crédence.	
23/11/23	AR doit adapter ses plans. MO/COMM est occupé à finaliser les plans techniques.	
30/11/23	AR a adapté ses plans. MO/COMM est occupé à finaliser les plans techniques.	MO/COMM
7.2.	<u>Devis EG pour les modifications acquéreurs :</u>	
07/09/23		EG
30/11/23	La Shopping List a été passée en revue en réunion. MO va mettre à jour la Shopping List et EG met à jour son tableau de calcul des suppléments acquéreur.	MO/COMM MO
14/12/23	En cours.	
7.3.	<u>Remplacement des bains par des douches :</u>	
07/09/23		
16/11/23	EG/TS s'est entretenu avec son fournisseur. il en ressort que la plupart des bains pourront être remplacés par des douches, conformément aux demandes de MO/COMM. EG/TS transmettra ses plans EXE et se concertera avec MO/COMM à propos des cas qui posent problème.	EG
23/11/23	EG/TS a validé tous les changements et a transmis à MO/COMM.	EG/TS MO/COMM
7.4.	<u>Carrelage :</u>	
05/10/23		
26/10/23	Concernant le carrelage des salles de bain/douche des blocs D-E-F (grande hauteur), si le faux plafond se situe en dessous de 250 cm, le carrelage est posé sur toute la hauteur. Si le faux plafond se situe au-dessus de 250cm, le carrelage est posé à hauteur de porte avec un module entier et le carrelage coupé se trouve au niveau du sol.	
23/11/23	MO/COMM et EG vont faire venir les échantillons de carrelages pour le choix des couleurs dans les parties communes.	
07/12/23	Dans le descriptif commercial, il est indiqué que les carrelages vont partout jusqu'au plafond. Donc, dans les blocs D, E & F, on place les faux-plafonds à 270cm.	EG
	Dans les autres cas, on va jusqu'au plafond ou jusqu'au faux plafond quand il y en a un.	MO/COMM
	<u>Note hors réunion :</u>	
	Dans l'appartement F.0.B. la salle de douche est en façade et, on ne peut pas prévoir de faux-plafond à cause de la présence de la fenêtre. Décision sur hauteur du carrelage à prendre ; selon AR, aller jusqu'au plafond dans ce cas précis risque de ne pas être esthétique.	
14/12/23	Pour l'appartement F.0.B., les carrelages vont jusqu'à 270cm malgré l'absence de faux-plafond.	
7.5.	<u>Changement et upgrade de certaines cuisines :</u>	
12/10/23	MO/COMM modifie ses plans et informera AR pour adaptation des plans COM.	AR
30/11/23	MO/COMM intégrera les modifications des cuisines sous 2 à 3 semaines et les transmettra à AR pour MAJ des plans ARCHI.	MO/COMM
14/12/23	Il reste à arrêter les choix de couleurs pour les cuisines des invendus. S'il y a toutefois un acquéreur, il peut encore changer le mobilier de cuisine mais sans modifications des techniques électriques et sanitaires.	
7.6.	<u>Position des chaudières et double-flux :</u>	
23/11/23	La position des chaudières et des groupes double-flux a changé. EG/TS doit préciser à MO/COMM quels appartements sont concernés par la modification	EG/TS AR

30/11/23	pour adapter les plans COMM et les plans AR. EG/TS va transmettre les plans coordonnés avec la position des chaudières et groupes double-flux, surtout pour ce qui concerne les modifications d'implantation des chaudières et groupes double flux par rapport aux plans AR et COMM	MO/COMM
7.7. 14/12/23	<u>Appartement témoin :</u> MO confirme que l'appartement E.1.B. servira d'appartement témoin et sera réceptionné en Mai 2024. Les finitions de cet appartement seront aussi valables pour le lot F voisin. Le planning et la sécurité des accès sera à mettre en place avec EG. Il faudra également soigner les abords à rue du côté de l'entrée de l'appartement E.1.B.	MO MO/COMM EG

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
8.1. 27/04/23 14/12/23	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion TS en présence de TS et EG/TS le vendredi 12/01/24	TS EG/TS	12/01/24
8.2. 27/09/22 26/10/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants - SIBELGA :</u> <u>Cabine HT :</u> EG doit faire une proposition de plan d'aménagement de la cabine, à soumettre à SIBELGA pour approbation, malgré le fait qu'on soit en présence d'une cabine client. EG/TS doit centraliser les informations afin de transmettre à SIBELGA les documents demandés. EG/TS a transmis les informations à SIBELGA. MO va prendre contact avec SIBELGA.	MO EG/TS	
8.3. 26/10/23 07/12/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants - SIBELGA - Gaz :</u> Demande de prix en cours.		
8.4. 17/08/23 23/11/23	<u>Gestion partie « publique » du parking :</u> Le fournisseur propose un système de reconnaissance de plaque avec caméra (validation chez un commerçant ou paiement via la plateforme en ligne). Pour l'accès aux ascenseurs, le fournisseur propose un clavier alphanumérique afin d'insérer le numéro de la plaque d'immatriculation. MO attend un retour de prix ainsi que la faisabilité de ce clavier. MO précise qu'on garderait la porte sectionnelle ainsi que la barrière du parking.	EG MO	
8.5. 28/09/23 26/10/23	<u>Entrée des impétrants - VIVAQUA :</u> Suite contacts avec les responsables de VIVAQUA, EG/TS précise qu'il faut compter 1 mois entre la confirmation de commande et l'intervention sur site pour l'introduction de la conduite d'eau dans le bâtiment.	EG	
8.6. 28/09/23 26/10/23 23/11/23 07/12/23 14/12/23	<u>Entrée des impétrants - PROXIMUS :</u> Ni MO, ni EG n'ont de nouvelles de PROXIMUS. MO a reçu les informations de EG. MO doit envoyer la demande. En cours chez MO. OK envoyé à PROXIMUS.	MO	
8.7. 05/10/23 26/10/23 02/11/23 07/12/23	<u>Raccordement eaux usées/eaux pluviales à l'égouttage public :</u> MO a donné une mission externe au bureau HCO afin de recalculer les eaux. Une réunion a été tenue en TEAMS le 03/10/23. MO n'a pas encore de retour de HCO. MO a eu un contact avec HCO lundi 30/10/23, qui l'a informé qu'il transmettrait ses calculs pour le vendredi 03/11/23. HCO a fait les calculs pour le dimensionnement des évacuations d'eaux de pluie. MO a aussi demandé le même travail de vérification pour les raccordements des eaux usées.	MO HCO	
8.8. 12/10/23	<u>Gestion des bornes de recharge voitures électriques :</u> La localisation des armoires de gestion des bornes de recharge voitures doit encore être finalisée. Les équipements sont actuellement prévus dans le local surpresseur, contre la façade. Mais comme on supprime le contre-mur devant les pieux, il faut vérifier ou		

02/11/23 23/11/23	on place les armoires et équipement du gestionnaire des bornes électriques. Il faut les maintenir le plus près possible de la cabine HT. MO informe qu'il n'y aura pas de borne après la porte sectionnelle. Les bornes se trouvant avant la porte sectionnelle sont encore sujettes à discussion. MO doit également décider ce qu'il en est du chemin de câble, du tableau électrique et du bouton pompier.	MO	
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.9. 27/04/23 26/10/23	<u>Cabine haute tension :</u> TS précise qu'il faut prévoir un système de réarmement automatique en cas de coupure de courant réseau, pour éviter les coupures de courant trop longues dans les parties communes de l'immeuble. EG est en train de faire la demande de prix. L'offre ne nécessite pas d'avoir les plans pour la remise de prix.	TS EG	
8.10. 31/08/23	<u>Alimentation électrique des appartements :</u> TS demande aussi à EG/TS de transmettre les notes de calcul des alimentations des appartements depuis les compteurs privatifs, pour vérifier la pertinence des raccordements en 10 ² et/ou en 16 ² . Calculs encore à fournir par EG/TS.	EG/TS	
28/09/23 07/12/23	Encore à faire.		
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.11. 26/05/23 12/10/23 23/11/23	<u>Implantation des équipements locaux compteurs.</u> Mis à jour chez AR et en attente de confirmation par EG/TS + SIBELGA. Point d'attention : Ne pas oublier que la FT des surpresseurs sprinklage doit être validée par VIVAQUA.	EG/TS AR	
8.12. 21/09/23	<u>Raccordement égouttage public</u> Le raccordement à l'égouttage public ne pourra pas se faire au niveau de la cave n°13 située au sous-sol -1. Le passage des pieux devra être déplacé et EG va faire un relevé des raccordements.	AR EG TS MO	
07/12/23	EG/TS précise que les détails de raccordements ont été modifiés pour ne plus impacter la cave 13. Les 2 branches des raccordements, venant de gauche et de droite, sortent du bâtiment avant de passer par les 2 caves 12 et 13.		
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.13. 21/09/23 23/11/23	<u>Gestion d'humidité/condensation</u> TS préconise de mettre la sonde hygrométrique dans les gaines qui mènent aux caves plutôt qu'à l'extérieur dans le jardin.	TOUS	
07/12/23	Suivant conseil de TS, EG/TS fera modifier les ventilations des sous-sols pour pulser l'air dans les couloirs de cavettes et faire les reprises dans les cavettes elles-mêmes.		
8.14. 23/11/23	<u>Continuité ventilation parking SS -1 :</u> TS précise qu'il faut conserver un passage d'air (20.000 m³/h) au travers de la porte sectionnelle qui sépare la partie privée de la partie publique du parking. 3 solutions possibles : 1) Partie grillagée dans la porte sectionnelle 2) Espace libre au-dessus de la porte sectionnelle 3) Remplacement du mur entre les places de parking 15 et 16 par une cloison grillagée EG fera une proposition.	EG TS MO	
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.15. 31/08/23	<u>Vérification des plans d'exécution :</u>		
21/09/23	<u>Finitions cabines :</u> Ascenseur vélos : inox 3.16. (Résistant aux intempéries) pour toutes les faces Ascenseur de personnes : inox pour les portes des ascenseurs A ->F et stratifié chêne clair pour les parois latérales. Tous les ascenseurs : réservation sol de 23 mm pour carrelage.		
19/10/23	EG/TS précise qu'il n'a pas encore eu de retour de l'ascensoriste suite aux remarques faites en réunion.		

16/11/23	Le supplément pour la finition stratifié chêne est refusé par MO. Les ascenseurs, décrits en base avec inox pour l'intérieur de la cabine, sont maintenus. AR valide.	EG/TS	
23/11/23	Les FT corrigées ont été déposées sur Cooperlink pour vérification et approbation.	MO AR	RAPPEL

9. CONSEILLER PEB

9.1.	<u>Isolation des sous-sols :</u>		
14/09/23			
07/12/23	Reste encore à solutionner l'isolation à l'interface entre rampe voiture et appartement C.O.B. Pour parler MO propose d'inviter la responsable PEB à la prochaine réunion de chantier.	PEB	
9.2.	<u>Choix des vitrages :</u>		
07/12/23	Pour l'appartement C.O.B., PEB demande de prévoir des vitrages avec un facteur solaire très différent des facteurs solaires des autres châssis du chantier, pour compenser le déficit de performance énergétique de cet appartement. De telles différences de facteur solaire ne sont pas acceptables à cause des différences de teinte de vitrage qui se verront très fortement. Il faut essayer de voir ou il est possible de gagner des points sur d'autres aspects de l'enveloppe de cet appartement, pour pouvoir garder des vitrages semblables aux vitrages voisins. Des pistes possibles sont : Meilleure étanchéité à l'air de cet appartement Majorer les épaisseurs d'isolants si c'est encore possible (façades, mur d'interface avec rampe parking) Placer plus de panneaux solaires pour cet appartement.	PEB	
14/12/23	Il y a une réunion prévue avec PEB le vendredi 15/12/23.		

10. COORDINATION SECURITE-SANTE

	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
10.1.	<u>Présence de CSS aux réunions de chantier :</u>		
26/10/23	MO précise qu'il faut organiser des réunions régulières de la cellule de coordination, en présence de tous les bureaux d'études et de l'entreprise. MO contacte CSS afin d'organiser de telles réunions régulièrement.	MO CSS	

11. ACOUSTIQUE

11.1.	<u>Approbation des FT :</u>		
26/10/23	EG rappelle qu'AC doit approuver les FT qui la concerne sur Cooperlink. EG contacte AC pour mise à jour.	EG AC	

12. ABORDS

12.1.	<u>Terrasse appartement D.O.A. :</u>		
06/07/23	ABO doit encore faire la mise à jour de son plan d'aménagement pour rajouter la terrasse de l'appt D.O.A.	ABO	
14/09/23	Solution pour aménagement de cette terrasse encore à mettre au point chez ABO.		
12.2.	<u>Récolte des eaux du couvrant parking intérieur d'ilot :</u>		
17/08/23			
28/09/23	ABO a transmis les quantités d'eau de pluie qui sont à récolter pour l'espace du patio. Il faut vérifier comment la récolte de ces eaux de pluie se répartit dans les raccordements existants ou non. Normalement, pour le permis d'environnement, des quantités d'eau de pluie ont aussi été définies. On peut vérifier les chiffres donnés pour comparaison.	ABO ABO	
12.3.	<u>Aménagement patio central :</u>		
14/09/23	MO demande à ABO de faire des propositions de variantes pour réduire les coûts des bancs et tables, ainsi que les coûts des bordures en acier corten délimitant les zones de gravier.		
23/11/23	Le plan mis à jour a été transmis par mail.	ABO	

12.4. 16/11/23	<u>Encombrement poutre au -1 à l'angle du bloc A :</u> <i>En fonction de l'encombrement de la poutre emballée, il faudra vérifier qu'il n'y a pas de modifications des abords pour le chemin de gravier périphérique.</i> <i>Voir point 6.7- Saillie poutre au -1 à l'angle du bloc A</i>	ABO
12.5. 14/12/23	<u>Zones de plantations sous les balcons :</u> MO a discuté avec ABO au sujet de la mauvaise reprise des plantes dans les parterres sous les balcons. Il faut prévoir des plantes demandant peu d'eau (fougères, lierres) ou des aménagements minéraux (gravier pierres de rocaille).	ABO MO

13. POINTS POUR MEMOIRE

13.1.

ARCHITECTURE

Parement façade :

Choix brique de parement : WIENERBERGER Eligna Silva Greige

Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771

Balcons béton architectonique :

Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70

Châssis :

Choix teinte IN et OUT : RAL 6012 Mat (vert noir)

Profilé de marque ALUK et modèle Triton Revive

DEP :

Teinte RAL 6012 Mat (vert noir)

13.2.

STABILITE

13.3.

TECHNIQUES SPECIALES

Choix des sous-traitants :

Chauffage :

CAUVIN

Sanitaire :

LEGRAND

Ventilation :

BELVENT

Electricité :

HIFLOW

Sprinklage :

IFC

Astrid :

CONNEXT

Ascenseurs :

KONE.

Châssis :

ARALU

13.4.

PEB

13.5.

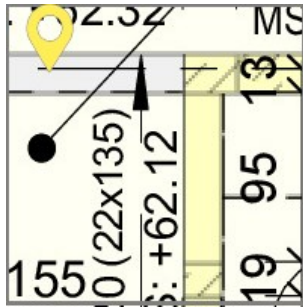
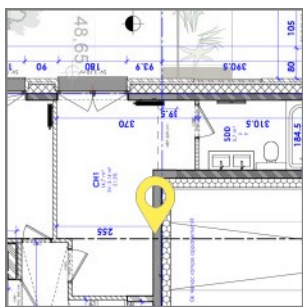
ABORDS

ERAS - Remarques AR Visites chantier - N°47 - 30-11-23

Projet : Erasmus Garden lot I

Adresse Chantier : - Anderlecht, Belgique

Nom
Jean-Charles De Groote

Nr	Sujet
1.06	Raccord plafond / maçonnerie parois locaux HT et compteurs ELEC 1.06 - jc degroote Vérifier la conformité Rf si maçonnerie s'arrête sous l'isolant MULTIPOR plutôt que contre le plafond béton.
099_G	   099_G 099_G 20231214_105018
1.07	Poutre P.02 haut +3 1.07 - jc degroote La poutre n'existe plus. STAB demande de reconstituer les étriers sur l'épaisseur de la dalle, en recoupant le haut et la bas des étriers existants, pour les assembler avec un recouvrement suffisant.
S8190-EX-CO-LOT I-007_J_Haut du R+3	   S8190-EX-CO-LOT I-007_J_Haut du R+3 S8190-EX-CO-LOT I-007_J_Haut du R+3 20231214_112101
1.08	Position tête de sprinklage dans l'isolant plafond rampe entrée parking 1.08 - jc degroote Vérifier si la tête de sprinklage est OK niveau efficacité lorsque placée dans un creux d'isolant.
100_M	   100_M 100_M 20231214_112809
