

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 50

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 26/01/2024, de 09h00 à 12h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO MO/COM	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Frédéric LESIRE Elise HENDRICKX Harold BURNET Nuria GOMEZ FRIAS	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : flesire@bpi-realestate.com T : 0497/514.587 E : ehendrickx@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	X	X X X X X X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Ludovic BRIARD Ingénieur de projet Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 493 76 84 47 E : ludovic.briard@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be	X Part Part Part	X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Anastasia SYMEONIDOU – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	X X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : +32 478 48 39 72 E : apa@tpf.be	X	X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be	X	X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS Ana AVRAM	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be E : peb.management@tpf.be		X X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be		X
COORD SECURITÉ SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal enaqua les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Vendredi 02/02/24 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	OBJET	ACTION	DATE
1.	GENERALITES - ADMINISTRATION		
2.	PLANNING		

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privés : 15/11/2024
------------------	------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	261			501
Du 19/01/24 au 26/01/24 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	268	0	0	494

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1.

06/10/22

26/01/24

Avancement chantier

Général

- Maçonneries non portantes en cours au sous-sol -1
- Pose des canalisations de gaz en cours au plafond du -1.
- Pose des canalisations de sprinklage en cours au -1
- Pose de l'isolant MULTIPOR au plafond du -1 en cours
- Début pose des colonnes verticales de décharges E.U.
- Premiers châssis posés sur chantier, sans vitrage.

Bloc A :

- Couvrant +5 posé

Bloc B :

- Couvrant +5 en cours

Bloc C :

- Début verticaux +5

Bloc D :

- Couvrant +4 en cours

Bloc E :

- Couvrant +4 en cours


Bloc F :

- Couvrant +3 fini
- Mur d'acrotère posé

3. DECOMPTES			
3.1.	<u>Adaptations PEB :</u>		
12/10/23	Suite aux résultats des encodages transmis par PEB, des adaptations sont à prévoir.	MO	
	Voir commentaire point 9.2 Isolation des sous-sols.		
3.2.	<u>Étanchéité des carrelages :</u>		
02/11/23	Conformément à ce qui a été fait dans le Lot H précédemment, EG avait chiffré l'étanchéité sous les carrelages des SDB (entourage douches et baignoires) mais ce poste n'a pas été retenu dans le bon de commande final. EG recommande fortement de prévoir cette étanchéité. Selon EG, le choix du système d'étanchéité liquide ou via membrane n'a pas d'incidence sur le prix.	MO	
3.3.	<u>Cabine HT :</u>		
12/01/24	Dans l'état actuel du contrat, le poste est en somme à justifier : le budget est à finaliser.	MO	
19/01/24	EG envoie à MO une estimation de prix.	EG	
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1.	<u>Remarques faites sur LETSBUILD :</u>		
	Remarques faites sur chantier : Voir listing des remarques sur la plateforme LETSBUILD + Listing récapitulatif des remarques de la semaine en annexe du présent PV.	MO	
4.2.	<u>Luminaire public trop proche d'un balcon, Avenue des Lilas :</u>		
24/08/23			
19/10/23	Le luminaire de la façade Sud a été déplacé d'environ 1,50m vers la gauche. Il faut encore décaler le luminaire de la façade Est.	MO	
4.3.	<u>Blocage des pieds de volée d'escalier au sous-sol :</u>		
26/10/23	Pour la première volée du SS -1 vers le Rez de l'escalier E, EG doit vérifier la fixation de pied de volée.	EG	
4.4.	<u>Installation des conduites de sprinklage sous-sol :</u>		
23/11/23			
12/01/24	EG ayant ajouté l'isolant PUR 20cm demandé par PEB, les quatre têtes de sprinklage se retrouvent encastrées dedans. TS propose de retourner (tête vers le bas) les deux têtes de sprinklage et les deux autres sont retournées et décalées d'un mètre pour être hors gabarit 2m10.		
26/01/24	TS précise que si on tourne les têtes de sprinklage vers le bas, il faut adapter le modèle des têtes.	EG TS	
4.5.	<u>Installation des conduites de gaz sous-sol :</u>		
23/11/23	Il faut laisser la place pour passer au-dessus, ou prévoir des potences pivotantes pour permettre de faire l'entretien des têtes de détecteurs de fumée.	EG	
4.6.	<u>Saignées sanitaires dans les carreaux de plâtre :</u>		
19/01/24	MO remarque qu'à plusieurs endroits les saignées sont fort profondes. De ce fait, on passe souvent à travers la cloison. MO demande à EG de prendre plus de soin pour réaliser les saignées au plus juste.		
26/01/24	L'avis de AC a été demandé. EG s'emploie à apporter le plus grand soin aux saignées mais rappelle que pour encastrer un tuyau ø50 minimum 2cm de profondeur, on arrive très vite de l'autre côté de la paroi de 10cm.	EG MO AC	
5. STABILITE			
5.1.	<u>Coordination des plans STAB :</u>		
27/09/22			
	<u>Acrotères en béton coulé / préfabriqué :</u>		
19/10/23			
30/11/23	Suite à la réunion, SECO maintient que le béton des acrotères n'est pas étanche. SECO demande à minima une peinture hydrofuge sur le béton afin de le rendre étanche. MO et STAB valident la solution. Reste à définir le type de peinture à utiliser.	STAB EG MO SECO	

6. ARCHITECTURE

6.1.	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u>	
12/01/23		EG/TS
30/11/23	Un nouvel indice a été déposé sur COOPERLINK, pour vérification et approbation.	AR
07/12/23	AR doit encore faire la MAJ de son plan.	TS
19/01/24	Infos reçues de EG/TS. AR met à jour son plan. Pour l'appartement C.5.B, le débouché d'air vicié en toiture est proche de la fenêtre de l'appartement. AR envoie à TS pour avis.	
	Voir commentaire 8.15 Décalage des tuyaux en toiture	
6.2.	<u>Châssis.</u>	
09/03/23		EG
12/01/24	MO demande que les portes intérieures des sas soient munies d'électroaimants et non de gâches électriques comme prévu en base. Il faut ainsi prévoir du côté extérieur un boîtier à clé mais pas de badge, et du côté intérieur un bouton de libération. EG doit faire une proposition.	MO
6.3.	<u>Raccord pied de façade :</u>	
05/10/23	Suite à l'ajout du L de soutènement en béton contre la terrasse du bâtiment C, AR doit revoir le raccord de la façade en brique. Il faut prévoir la cassure dans le jardin, due à la différence de niveau entre le bâtiment C et D.	
23/11/23	AR a vérifié la FT de localisation des cornières de support des briques de parement, et remarque que les niveaux de ces cornières basses ne sont pas indiqués. Donc coordination avec le niveau du sol extérieur difficile.	ABO AR EG
6.4.	<u>Briques Ecobrick :</u>	
05/10/23		
30/11/23	Suite à la réunion du 29/11/23 entre EG et SECO, un retour de SECO est attendu suite aux remarques concernant les Ecobrick.	
07/12/23	SECO a donné son accord sur l'utilisation des ECOBRICK, mais reste toujours sur sa position de refus pour ce qui est des appareillages de maçonnerie en briques verticales.	
12/01/24	Suite au refus de SECO, MO et EG proposent des bandeaux verticaux de 90 cm, en pose de briques horizontales alignées. AR vérifie en interne si cette solution est acceptable.	
19/01/24	AR a fait des nouvelles propositions de calepinage en prévoyant une pose de briques horizontales alignées pour les panneaux latéraux des châssis. Ces panneaux sont conservés à 1cm en retrait. Il y a quelques panneaux en 90cm de large : AR confirme que ce n'est pas une erreur.	EG AR MO
26/01/24	AR a envoyé son détail de calepinage moucharabieh. EG fait remarquer qu'il y a deux briques en porte-à-faux au-dessus de chaque trou. EG préfère ponter chaque trou avec une brique entière. AR fera une proposition.	
6.5.	<u>Local vélos :</u>	
12/10/23		
23/11/23	EG pose la question de la finition du local : vu l'hétérogénéité des matériaux des murs (béton, blocs silico-calcaire, blocs de béton) EG demande s'il ne faudrait pas envisager une finition murale pour homogénéiser le tout. EG et MO doivent vérifier ce qui est prévu comme finition pour ce local dans le bon de commande.	MO EG
6.6.	<u>Mise à jour des faux plafonds :</u>	
12/10/23		
23/11/23	EG propose de rajouter un faux plafond dans le sas d'entrée du bloc F afin de dévier la décharge sanitaire de la trémie T5F vers la trémie T2F. En effet, il n'y a pas assez de hauteur sous plafond au niveau du sous-sol -1. MO et AR donnent leur accord.	
30/11/23	EG est en attente des plans EXE modifiés.	
19/01/24	EG/TS a envoyé les faux-plafonds nécessaires au raccordement des chaudières. AR met à jour son plan.	EG/TS AR
26/01/24	En cours.	
6.7.	<u>Carrelages communs :</u>	
14/12/23		
12/01/24	EG informe que les quatre autres échantillons arriveront pour la réunion du 19/01/24.	AR MO EG
19/01/24	Les échantillons ont été apportés au chantier. Le choix définitif suivant a été arrêté par MO.	

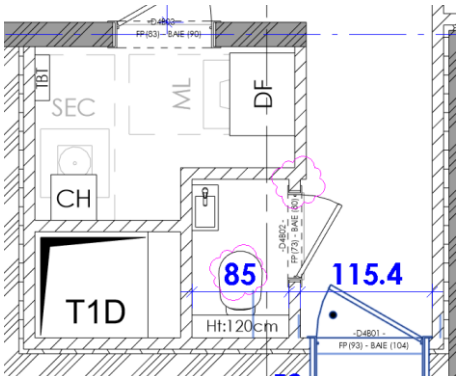6.8. 16/11/23 23/11/23 30/11/23	<u>Porte SAS ascenseur sous-sol -1 :</u> AR a eu un contact avec ASSA ABLOY qui informe qu'il existe des ferme-porte équipées d'un système de retard à la fermeture qui pourraient convenir. EG approuve cette solution et prendra contact avec son fournisseur lors de la mise au point des bordereaux de portes intérieures.	 EG
6.9. 14/12/23 12/01/24	<u>Numéros de police :</u> MO transmet à AR les plans numérotés pour intégration des numéros de police dans les plans AR. Fait.	 MO AR
6.10. 12/01/24 19/01/24 26/01/24	<u>Garde-corps :</u> Les garde-corps fixés aux châssis ont été approuvés. Concernant les garde-corps des balcons, le raccord au sol reste à discuter. EG vérifie s'il est possible d'élargir le tube inférieur. EG a transmis les propositions des garde-corps modifiés. AR a transmis ses remarques en réunion. AR transmettra, pour info, le scan du plan annoté, par mail. EG a transmis la version adaptée en fonction des remarques.	 EG AR
6.11. 12/01/24 26/01/24	<u>Portes d'entrée des appartements :</u> Dans les appartements F0B/E0B/D0A, la largeur du couloir est de 101 ou 105cm. Suite à l'expérience du lot H, le menuisier craint que les portes ne puissent pas s'ouvrir à 90°. EG vérifie dans l'appartement non vendu du lot H quelle est la dimension hors-tout de la porte lorsqu'elle est ouverte à 90°. Cela permettra de vérifier si le couloir de 105cm est suffisant pour l'ouverture complète de la porte. Pour le couloir de 101 cm, la porte est rentrée dans l'épaisseur du mur. Concernant l'appartement D.0.A, on craint que la porte d'entrée tape sur la béquille de la porte du WC (même porte de WC fermée). MO contacte MO/COMM pour savoir s'il est envisageable de tourner la porte de sens comme dans l'appartement E.0.B. Pour les appartements D.1-2-3.A et D.1-2-3.C et D.4.B, la largeur du WC passe à 85cm afin d'élargir le couloir et permettre d'ouvrir la porte d'entrée. Pour les appartements D.1-2-3.C et D.4.B, le déplacement de la cloison induit une décroché au niveau du WC.	  MO MO/COMM EG
6.12. 12/01/24 19/01/24	<u>Arborescence des clés :</u> MO a transmis une proposition d'arborescence de clés. Pour la porte sectionnelle au SS -1 à l'intérieur du parking, il faut prévoir un boîtier à clé avec un demi cylindre à intégrer dans l'arborescence des clés. MO va fournir une mise à jour.	 MO
6.13. 26/01/24	<u>Retournement des WC :</u> TS remarque que les tuyaux d'évacuation passent sous le WC dans le sol, ce qui n'est pas réalisable. EG propose de retourner le WC des appartements B.X.B pour que la cloison soit plus proche de la colonne de trémie ; pour tous les étages sauf le rez.. TOUS sont ok. De ce fait, les portes du WC sont translatées vers la gauche.	 TS EG

7. GESTION ACQUEREURS

7.1. 22/06/23 16/11/23 23/11/23 30/11/23	<u>Plan techniques DESCO et CUISINES :</u> Pour trois appartements, il faudra décaler la porte du séjour de 10cm pour donner plus de place dans la cuisine. L'interrupteur de l'entrée du séjour doit être intégré dans le plan cuisine car il y a un risque de conflit entre interrupteur et crédence. AR doit adapter ses plans. MO/COMM est occupé à finaliser les plans techniques. AR a adapté ses plans. MO/COMM est occupé à finaliser les plans techniques.	 MO/COMM
7.2. 07/09/23 30/11/23 14/12/23	<u>Devis EG pour les modifications acquéreurs :</u> La Shopping List a été passée en revue en réunion. MO va mettre à jour la Shopping List et EG met à jour son tableau de calcul des suppléments acquéreur. En cours.	 EG MO/COMM MO

7.3. 07/09/23 16/11/23 23/11/23	<u>Remplacement des bains par des douches :</u> EG/TS s'est entretenu avec son fournisseur. il en ressort que la plupart des bains pourront être remplacés par des douches, conformément aux demandes de MO/COMM. EG/TS transmettra ses plans EXE et se concertera avec MO/COMM à propos des cas qui posent problème. EG/TS a validé tous les changements et a transmis à MO/COMM.	EG EG/TS MO/COMM
7.4. 05/10/23 26/10/23 23/11/23 07/12/23 14/12/23	<u>Carrelage :</u> Concernant le carrelage des salles de bain/douche des blocs D-E-F (grande hauteur), si le faux plafond se situe en dessous de 250 cm, le carrelage est posé sur toute la hauteur. Si le faux plafond se situe au-dessus de 250cm, le carrelage est posé à hauteur de porte avec un module entier et le carrelage coupé se trouve au niveau du sol. MO/COMM et EG vont faire venir les échantillons de carrelages pour le choix des couleurs dans les parties communes. Dans le descriptif commercial, il est indiqué que les carrelages vont partout jusqu'au plafond. Donc, dans les blocs D, E & F, on place les faux-plafonds à 270cm. Dans les autres cas, on va jusqu'au plafond ou jusqu'au faux plafond quand il y en a un. <u>Note hors réunion :</u> Dans l'appartement F.0.B. la salle de douche est en façade et, on ne peut pas prévoir de faux-plafond à cause de la présence de la fenêtre. Décision sur hauteur du carrelage à prendre ; selon AR, aller jusqu'au plafond dans ce cas précis risque de ne pas être esthétique. Pour l'appartement F.0.B., les carrelages vont jusqu'à 270cm malgré l'absence de faux-plafond.	EG MO/COMM
7.5. 12/10/23 30/11/23 14/12/23	<u>Changement et upgrade de certaines cuisines :</u> MO/COMM modifie ses plans et informera AR pour adaptation des plans COM. MO/COMM intégrera les modifications des cuisines sous 2 à 3 semaines et les transmettra à AR pour MAJ des plans ARCHI. Il reste à arrêter les choix de couleurs pour les cuisines des invendus. S'il y a toutefois un acquéreur, il peut encore changer le mobilier de cuisine mais sans modifications des techniques électriques et sanitaires.	AR MO/COMM
7.6. 23/11/23 30/11/23	<u>Position des chaudières et double-flux :</u> La position des chaudières et des groupes double-flux a changé. EG/TS doit préciser à MO/COMM quels appartements sont concernés par la modification pour adapter les plans COMM et les plans AR. EG/TS va transmettre les plans coordonnés avec la position des chaudières et groupes double-flux, surtout pour ce qui concerne les modifications d'implantation des chaudières et groupes double flux par rapport aux plans AR et COMM	EG/TS AR MO/COMM
7.7. 14/12/23	<u>Appartement témoin :</u> MO confirme que l'appartement E.1.B. servira d'appartement témoin et sera réceptionné en Mai 2024. Les finitions de cet appartement seront aussi valables pour le lot F voisin. Le planning et la sécurité des accès sera à mettre en place avec EG. Il faudra également soigner les abords à rue du côté de l'entrée de l'appartement E.1.B.	MO MO/COMM EG
7.8. 26/01/24	<u>Planning choix MO appartements invendus :</u> EG va actualiser les dates de remise des choix définitifs des finitions et couleurs pour les sols/cuisines/sanitaires. Les nouvelles dates tiendront compte de la stratégie de planification des travaux.	EG MO
7.9. 26/01/24	<u>Meuble double des sanitaires :</u> Pour les sanitaires des appartements F.1.B et F.2.B, un meuble double 120cm était prévu, avec le sèche serviette au-dessus de la baignoire. L'acquéreur avait donné son accord pour le remplacer par un meuble de 80cm. EG informe que les saignées pour le meuble double ont déjà été faites. MO/COMM contacte l'acquéreur pour vérifier s'il convient de revenir au meuble double.	EG MO MO/COMM

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
8.1. 27/04/23 26/01/24	Prochaine réunion TS : Prochaine réunion TS en présence de TS et EG/TS le vendredi 09/02/24	TS EG/TS	09/02/24
8.2. 27/09/22 26/10/23 02/11/23 23/11/23 12/01/24 26/01/24	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants - SIBELGA :</u> <u>Cabine HT :</u> EG doit faire une proposition de plan d'aménagement de la cabine, à soumettre à SIBELGA pour approbation, malgré le fait qu'on soit en présence d'une cabine client. EG/TS doit centraliser les informations afin de transmettre à SIBELGA les documents demandés. EG/TS a transmis les informations à SIBELGA. MO va prendre contact avec SIBELGA. L'offre SIBELGA a été validée par MO et EG/TS et payée. SIBELGA précise qu'il aura besoin des plans d'installation de la cabine avant son raccordement, qui aura lieu lorsque le local sera réceptionné. EG/TS a envoyé la FT et la preuve de paiement a été reçue par MO.	MO EG/TS	
8.3. 26/10/23 12/01/24	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants - SIBELGA - Gaz :</u> Offre reçue et en cours de paiement.	MO	
8.4. 17/08/23 23/11/23	<u>Gestion partie « publique » du parking :</u> Le fournisseur propose un système de reconnaissance de plaque avec caméra (validation chez un commerçant ou paiement via la plateforme en ligne). Pour l'accès aux ascenseurs, le fournisseur propose un clavier alphanumérique afin d'insérer le numéro de la plaque d'immatriculation. MO attend un retour de prix ainsi que la faisabilité de ce clavier. MO précise qu'on garderait la porte sectionnelle ainsi que la barrière du parking.	EG MO	
8.5. 28/09/23 26/10/23	<u>Entrée des impétrants - VIVAQUA :</u> Suite contacts avec les responsables de VIVAQUA, EG/TS précise qu'il faut compter 1 mois entre la confirmation de commande et l'intervention sur site pour l'introduction de la conduite d'eau dans le bâtiment.	EG	
8.6. 28/09/23 26/10/23 23/11/23 07/12/23 14/12/23	<u>Entrée des impétrants - PROXIMUS :</u> Ni MO, ni EG n'ont de nouvelles de PROXIMUS. MO a reçu les informations de EG. MO doit envoyer la demande. En cours chez MO. OK envoyé à PROXIMUS.	MO	
8.7. 05/10/23 26/10/23 02/11/23 07/12/23 12/01/24	<u>Raccordement eaux usées/eaux pluviales à l'égouttage public :</u> MO a donné une mission externe au bureau HCO afin de recalculer les eaux. Une réunion a été tenue en TEAMS le 03/10/23. MO n'a pas encore de retour de HCO. MO a eu un contact avec HCO lundi 30/10/23, qui l'a informé qu'il transmettrait ses calculs pour le vendredi 03/11/23. HCO a fait les calculs pour le dimensionnement des évacuations d'eaux de pluie. MO a aussi demandé le même travail de vérification pour les raccordements des eaux usées. En cours. MO prend contact avec HCO.	MO HCO	
8.8. 12/10/23 02/11/23 23/11/23 12/01/24	<u>Gestion des bornes de recharge voitures électriques :</u> La localisation des armoires de gestion des bornes de recharge voitures doit encore être finalisée. Les équipements sont actuellement prévus dans le local surpresseur, contre la façade. Mais comme on supprime le contre-mur devant les pieux, il faut vérifier ou on place les armoires et équipement du gestionnaire des bornes électriques. Il faut les maintenir le plus près possible de la cabine HT. MO informe qu'il n'y aura pas de borne après la porte sectionnelle. Les bornes se trouvant avant la porte sectionnelle sont encore sujettes à discussion. MO doit également décider ce qu'il en est du chemin de câble, du tableau électrique et du bouton pompier. En cours.	MO	

8.9. 26/01/24	<u>Analyse de risque :</u> L'analyse de risque a été préparée par TS et est à signer pour accord par MO.	TS MO	
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.10. 27/04/23 26/10/23 23/11/23 12/01/24 26/01/24	<u>Cabine haute tension :</u> TS précise qu'il faut prévoir un système de réarmement automatique en cas de coupure de courant réseau, pour éviter les coupures de courant trop longues dans les parties communes de l'immeuble. EG est en train de faire la demande de prix. La remise de plan est à faire à SIBELGA avant le raccordement. TS ne voit pas le TGBT de sortie de la cabine HT représenté dans les plans. Cette armoire est relativement imposante. Sa localisation est à déterminer avec EG/TS. EG/TS précise avoir indiqué une cabine à réarmement motorisée dans son offre et un TGBT de 630 Kva avec 8 départs (6 départs communs + 1 départ communs SS + 1 départ bornes voitures). Le délai prévisionnel annonce la mise en place des cabines des communs avant les congés estivaux. Sur question de TS, EG/TS confirme que le TGBT sera bien placé dans le local basse tension, position exacte à définir par EG/TS.	TS EG/TS	
8.11. 31/08/23 28/09/23 07/12/23 12/01/24	<u>Alimentation électrique des appartements :</u> TS demande aussi à EG/TS de transmettre les notes de calcul des alimentations des appartements depuis les compteurs privatifs, pour vérifier la pertinence des raccordements en 10² et/ou en 16². Calculs encore à fournir par EG/TS. Encore à faire. En cours.	EG/TS	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.12. 26/05/23 12/01/24	<u>Implantation des équipements locaux compteurs.</u> VIVAQUA doit effectuer la mise à jour du test de pression datant de 2022 pour approuver les FT des surpresseurs.	EG/TS AR	
8.13. 21/09/23 07/12/23	<u>Raccordement égouttage public</u> Le raccordement à l'égouttage public ne pourra pas se faire au niveau de la cave n°13 située au sous-sol -1. Le passage des pieux devra être déplacé et EG va faire un relevé des raccordements. EG/TS précise que les détails de raccordements ont été modifiés pour ne plus impacter la cave 13. Les 2 branches des raccordements, venant de gauche et de droite, sortent du bâtiment avant de passer par les 2 caves 12 et 13.	AR EG TS MO	
8.14. 26/01/24	<u>Ajout de trémie B.X.B :</u> Dans la colonne d'appartements B.X.B, la distance entre la SDB et la gaine technique est trop grande. De ce fait, une colonne de décharge encastree dans une trémie technique est ajoutée : 30x30cm hors tout avec un regard de visite sous le plafond du 5ème étage. AR et MO sont d'accord. EG prévient que les principes de récolte d'eau doivent être définis sous peu.	AR MO EG	
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.15. 12/01/24 26/01/24	<u>Décalage des tuyaux en toiture :</u> Les plans de ventilation en toiture ont été déposés sur Cooperlink pour remarques ou approbation. Le tuyau de la ventilation qui sort de la trémie T1D doit longer la façade et passer sous l'allège de la fenêtre. AR met à jour son plan. Au droit des trois terrasses sur la toiture plate (3-4-5èmes étages), il y a à chaque fois une trémie proche du conduit d'air vicié de ventilation. TS précise que pour les sorties de gaz brûlé, il était prévu que les rejets d'air soient déviés. EG/TS et TS discuteront de solutions possibles pour les rejets d'air vicié de ventilation.	EG EG/TS	
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.16. 21/09/23 23/11/23 07/12/23	<u>Gestion d'humidité/condensation</u> TS préconise de mettre la sonde hygrométrique dans les gaines qui mènent aux caves plutôt qu'à l'extérieur dans le jardin. Suivant conseil de TS, EG/TS fera modifier les ventilations des sous-sols pour pulser l'air dans les couloirs de cavettes et faire les reprises dans les cavettes elles-mêmes.	TOUS	

8.17. 23/11/23	<u>Continuité ventilation parking SS -1 :</u> TS précise qu'il faut conserver un passage d'air (20.000 m³/h) au travers de la porte sectionnelle qui sépare la partie privée de la partie publique du parking. 3 solutions possibles : 1) Partie grillagée dans la porte sectionnelle 2) Espace libre au-dessus de la porte sectionnelle 3) Remplacement du mur entre les places de parking 15 et 16 par une cloison grillagée EG fera une proposition.	EG TS MO	
	12/01/24 TS précise que pour une vitesse de 2m/s, on doit prévoir 2.7 m² de libre. On peut accepter une vitesse jusqu'à 2.5m/s – 3m/s pour légèrement réduire la section si nécessaire.		

TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS

8.18. 31/08/23	<u>Vérification des plans d'exécution :</u>	EG/TS MO AR	
	<u>Finitions cabines :</u> Ascenseur vélos : inox 3.16. (Résistant aux intempéries) pour toutes les faces Ascenseur de personnes : inox pour les portes des ascenseurs A ->F et stratifié chêne clair pour les parois latérales. Tous les ascenseurs : réservation sol de 23 mm pour carrelage. EG/TS précise qu'il n'a pas encore eu de retour de l'ascensoriste suite aux remarques faites en réunion. 16/11/23 Le supplément pour la finition stratifié chêne est refusé par MO. Les ascenseurs, décrits en base avec inox pour l'intérieur de la cabine, sont maintenus. AR valide. 23/11/23 Les FT corrigées ont été déposées sur Cooperlink pour vérification et approbation. 12/01/24 Les plans EXE ont été remis sur Cooperlink et approuvés.		

9. CONSEILLER PEB

9.1. 14/09/23 07/12/23	<u>Isolation des sous-sols :</u> Reste encore à solutionner l'isolation à l'interface entre rampe voiture et appartement C.0.B. Pour parler MO propose d'inviter la responsable PEB à la prochaine réunion de chantier.	EG PEB	
	12/01/24 EG a proposé à PEB de soigner les détails d'étanchéité à l'air pour améliorer son impact sur la performance globale de l'appartement C.0.B. Le choix de l'isolant se fera en fonction de cette performance.		
9.2. 07/12/23	<u>Choix des vitrages :</u> Pour l'appartement C.0.B., PEB demande de prévoir des vitrages avec un facteur solaire très différent des facteurs solaires des autres châssis du chantier, pour compenser le déficit de performance énergétique de cet appartement. De telles différences de facteur solaire ne sont pas acceptables à cause des différences de teinte de vitrage qui se verront très fortement. Il faut essayer de voir ou il est possible de gagner des points sur d'autres aspects de l'enveloppe de cet appartement, pour pouvoir garder des vitrages semblables aux vitrages voisins. Des pistes possibles sont : Meilleure étanchéité à l'air de cet appartement Majorer les épaisseurs d'isolants si c'est encore possible (façades, mur d'interface avec rampe parking) Placer plus de panneaux solaires pour cet appartement. Il y a une réunion prévue avec PEB le vendredi 15/12/23.	PEB	
	14/12/23 12/01/24 Suite à la réunion du 15/12/23, PEB a encore modifié certains éléments qui avaient pourtant été validés en réunion.		

10. COORDINATION SECURITE-SANTE

10.1. 26/10/23	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
	<u>Présence de CSS aux réunions de chantier :</u> MO précise qu'il faut organiser des réunions régulières de la cellule de coordination, en présence de tous les bureaux d'études et de l'entreprise. MO contacte CSS afin d'organiser de telles réunions régulièrement.	MO CSS	

11. ACOUSTIQUE

11.1.	<u>Approbation des FT :</u>	
26/10/23	EG rappelle qu'AC doit approuver les FT qui la concerne sur Cooperlink. EG contacte AC pour mise à jour.	EG AC
11.2.	<u>Portes acoustiques :</u>	
12/01/24	AR vérifie avec AC quelles sont les performances acoustiques demandées pour les portes entre les chambres et les séjours. Pour rappel, une porte 35 dB est prévue entre un local technique et une pièce de vie (WC et SDB compris).	AR AC
19/01/24	AC confirme qu'entre chambre et séjour il faut un affaiblissement de 35dB.	

12. ABORDS


12.1.	<u>Terrasse appartement D.0.A :</u>	
06/07/23	ABO doit encore faire la mise à jour de son plan d'aménagement pour rajouter la terrasse de l'appt D.0.A.	ABO
14/09/23	Solution pour aménagement de cette terrasse encore à mettre au point chez ABO.	
12.2.	<u>Récolte des eaux du couvrant parking intérieur d'ilot :</u>	
17/08/23		
28/09/23	ABO a transmis les quantités d'eau de pluie qui sont à récolter pour l'espace du patio. Il faut vérifier comment la récolte de ces eaux de pluie se répartit dans les raccordements existants ou non. Normalement, pour le permis d'environnement, des quantités d'eau de pluie ont aussi été définies. On peut vérifier les chiffres donnés pour comparaison.	ABO ABO
12.3.	<u>Aménagement patio central :</u>	
14/09/23	MO demande à ABO de faire des propositions de variantes pour réduire les coûts des bancs et tables, ainsi que les coûts des bordures en acier corten délimitant les zones de gravier.	
23/11/23	Le plan mis à jour a été transmis par mail.	ABO
12.4.	<u>Encombrement poutre au -1 à l'angle du bloc A :</u>	
16/11/23	En fonction de l'encombrement de la poutre emballée, il faudra vérifier qu'il n'y a pas de modifications des abords pour le chemin de gravier périphérique.	ABO
12.5.	<u>Zones de plantations sous les balcons :</u>	
14/12/23	MO a discuté avec ABO au sujet de la mauvaise reprise des plantes dans les parterres sous les balcons. Il faut prévoir des plantes demandant peu d'eau (fougères, lierres) ou des aménagements minéraux (gravier pierres de rocaille).	ABO MO

13. POINTS POUR MEMOIRE

	ARCHITECTURE	
13.1.	<u>Parement façade :</u> Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771 <u>Balcons béton architectonique :</u> Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70 <u>Châssis :</u> Choix teinte IN et OUT : RAL 6012 Mat (vert noir) Profilé de marque ALUK et modèle Triton Revive <u>DEP :</u> Teinte RAL 6012 Mat (vert noir)	

Sol locaux communs :

Quadrus



STABILITE

13.2.

TECHNIQUES SPECIALES

13.3.

Choix des sous-traitants :

<u>Chauffage :</u>	CAUVIN
<u>Sanitaire :</u>	LEGRAND
<u>Ventilation :</u>	BELVENT
<u>Electricité :</u>	HIFLOW
<u>Sprinklage :</u>	IFC
<u>Astrid :</u>	CONNEXT
<u>Ascenseurs :</u>	KONE.
<u>Châssis :</u>	ARALU

PEB

13.4.

ABORDS

13.5.
