

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 65

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 21/05/2024 – Semaine 21, de 14h30 à 16h30**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Frédéric LESIRE Elise HENDRICKX Harold BURNET	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : flesire@bpi-realestate.com T : 0497/514.587 E : ehendrickx@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	X	X X X X X X
	MO/COM	Nuria GOMEZ FRIAS			X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Jean-Philippe COENJAERTS Ludovic BRIARD Ingénieur de projet Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet Romain NICODEME Ingénieur de projet	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpcgroup.be T : +32 485 25 85 65 E : jean-philippe.coenjaerts@bpcgroup.be T : +32 493 76 84 47 E : ludovic.briard@bpcgroup.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpcgroup.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpcgroup.be T : +32 475 61 31 12 E : romain.nicodeme@bpcgroup.be	X Part Part	X X X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Anastasia SYMEONIDOU – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76 T : +32 486 17 18 55	X X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : +32 478 48 39 72 E : apa@tpf.be		X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be		X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be		X
		Ana AVRAM	E : peb.management@tpf.be		X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be		X
		Virginie GOVAERTS	T : 02 842 00 89 E : v.govaerts@jnc.be		X
COORD SECURITÉ SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be		X
		Goran DEMERDZIEV	E : goran.demerdziev@cosep.be		X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be		X
		Cédric ARTS	T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X
		Florian VANDENSTEEN	T : +32 496 93 39 13 E : f.vandensteen@seco.be		X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Mardi 28/05/24 de 13h00 à 16h00	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	OBJET	ACTION	DATE
----	-------	--------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

2.1. 30/04/24	<u>Congés chantier :</u> EG informe que le chantier sera fermé du 29 juillet au 5 août inclus. Durant la période du 13 juillet au 18 août, EG propose de suspendre les réunions de chantier pour se concentrer sur ses propres visites de RP.	TOUS	
-------------------------	--	-------------	--

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762 jours calendrier**

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	578			184
Du 14/05/24 au 21/05/24 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	585	0	0	177


Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. 06/10/22 12/04/24	<u>Avancement chantier</u> <u>Général</u> - Maçonneries non portantes en cours au sous-sol -1 et -2 - Pose des canalisations de gaz en cours au plafond du -1. - Pose des canalisations de sprinklage en cours au -1 et -2 - Trainantes horizontales décharges au plafond -1 en cours - Blocs B-C : cloisons intérieures des appartements au +5 fini - Bloc A : cloisons intérieures des appartements au +5 en cours - Isolation toiture blocs E & D fini, bloc C en cours - Parement de façade en cours au bloc F et E niveau +5 - Pose châssis et vitrage en cours au +4 - Carrelage sol Appts Bloc F +2 en cours, Rez Bloc E +2 en cours - Chapes en cours dans les blocs C, D, E & F.		
2.2. 23/04/24 30/04/24	<u>Programmation des pré-réceptions :</u> EG propose de commencer les pré-RP le 12 juillet (une demi-journée). A partir du 19 août, les pré-RP s'organiseraient en deux demi-journées par semaine avec deux équipes simultanées, soit 12 appartements par semaine, à raison de 3		

14/05/24	appartements/demi-journée/équipe. La fin des pré-RP est prévue pour le vendredi 4 octobre. MO/COMM n'étant pas disponible le 12 juillet, MO et MO/COMM proposent de faire la 1^{ère} pré-RP tous ensemble le mardi 25 juin de 11h à 12h, pour ajuster les niveaux de qualité attendus de chacun. EG avait prévu 6 semaines avant la date du 12 juillet pour son contrôle qualité mais puisque la date est avancée au 25 juin, EG précise que certains détails de finition ne seront peut-être pas encore finalisés. EG prépare au moins deux appartements afin d'avoir des configurations différentes. Ensuite, les pré-RP sont fixées au mardi (1/2 journée avec 2 équipes) et au vendredi jeudi (1 journée complète avec 1 équipe), à partir du 19 août jusqu'au 4 octobre.	MO/COMM EG MO	25/06/24 à 11h 19/08/24
2.2. 14/05/24	<u>Programmation des réceptions :</u> Sur question de MO, EG précise que les RP acquéreurs peuvent se faire après la réception des communs qui se fera début novembre.	EG MO	
2.3. 14/05/24	<u>Visite des pompiers :</u> EG attire l'attention sur la visite des pompiers pour la réception des ouvrages, à organiser fin octobre, juste avant le début des RP des parties communes.	EG MO	
2.4. 14/05/24	<u>Choix Syndic :</u> Une AG doit être organisée avec les acquéreurs pour confirmer le syndic dans sa tâche de représentation de l'AG pour la phase de réception des communs.	MO EG	

3. DECOMPTES			
3.1. 12/10/23	<u>Adaptations PEB :</u> Suite aux résultats des encodages transmis par PEB, des adaptations sont à prévoir. Voir commentaire point 9.1 Isolation des sous-sols.	MO	
3.2. 02/11/23	<u>Étanchéité des carrelages :</u> Conformément à ce qui a été fait dans le Lot H précédemment, EG avait chiffré l'étanchéité sous les carrelages des SDB (entourage douches et baignoires) mais ce poste n'a pas été retenu dans le bon de commande final. EG recommande fortement de prévoir cette étanchéité. Selon EG, le choix du système d'étanchéité liquide ou via membrane n'a pas d'incidence sur le prix.	MO	
3.3. 12/01/24 19/01/24 02/02/24	<u>Cabine HT :</u> Dans l'état actuel du contrat, le poste est en somme à justifier : le budget est à finaliser. EG envoie à MO une estimation de prix. Encore à faire.	MO EG	
3.4. 02/02/24	<u>Garde-corps :</u> EG a transmis une version plus esthétique. MO a donné son accord.	MO EG	
3.5. 02/02/24	<u>Modification porte de cuisine – appartement E.1.A :</u> La porte E1A07 va être décalée à 278cm du mur bloc silico-calcaire, dans la cloison qui a déjà été montée.	EG	
3.6. 29/03/24	<u>Peinture de l'appartement témoin E.1.B :</u> MO donne la mission à EG de peindre l'appartement témoin E.1.B.	EG MO	
3.7. 30/04/24	<u>Tableau décomptes :</u> MO demande à EG de préparer un tableau Excel des décomptes.	MO EG	

4. VISITE DU CHANTIER			
4.1.	<u>Remarques faites sur LETSBUILD :</u> Remarques faites sur chantier : Voir listing des remarques sur la plateforme LETSBUILD + Listing récapitulatif des remarques de la semaine en annexe du présent PV.	MO	
4.2. 24/08/23 19/10/23 23/02/24	<u>Luminaire public trop proche d'un balcon, Avenue des Lilas :</u> Le luminaire de la façade Sud a été déplacé d'environ 1,50m vers la gauche. Il faut encore décaler le luminaire de la façade Est. AR demande pourquoi le luminaire public semble attaché au balcon.	AR EG MO	

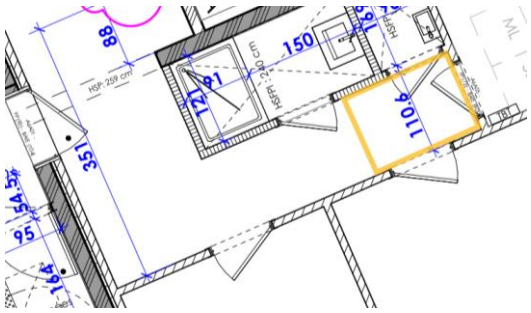08/03/24	Le socle du luminaire a été déstabilisé en creusant une tranchée le long de la façade.	
4.3. 26/10/23	<u>Blocage des pieds de volée d'escalier au sous-sol :</u> Pour la première volée du SS -1 vers le Rez de l'escalier E, EG doit vérifier la fixation de pied de volée.	EG
4.4. 23/11/23 12/01/24	<u>Installation des conduites de sprinklage sous-sol :</u> EG ayant ajouté l'isolant PUR 20cm demandé par PEB, les quatre têtes de sprinklage se retrouvent encastrées dedans. TS propose de retourner (tête vers le bas) les deux têtes de sprinklage et les deux autres sont retournées et décalées d'un mètre pour être hors gabarit 2m10.	EG TS
26/01/24	TS précise que si on tourne les têtes de sprinklage vers le bas, il faut adapter le modèle des têtes.	
4.5. 15/03/24	<u>Isolation trémie Asc vélos dans l'appt A1A :</u> Attention à l'étanchéité à l'air réalisée autour du socle de la trémie d'ascenseur dans l'appartement au 1er étage. Il faut que les raccords entre les lés de bande d'étanchéité soient parfaitement collés. A vérifier sur tout le pourtour. Ne pas oublier aussi de bien réaliser les raccords d'étanchéité à l'air autour de la ventilation haute de la trémie d'ascenseur. Prévoir un tube qui traverse l'isolant et la maçonnerie de remplissage de la baie (encore à murer sur la photo).	
14/05/24	OK vu place, les membranes ont été recollées. La coulisse doit être nettoyée avant d'être remplie d'isolant.	EG
4.6. 21/05/24	<u>Remarque SECO pied de parement de façade :</u> Dans son point 32.01, SECO demande de veiller à éviter les poussées sur les pieds de parement. EG/AR/MO ne comprennent pas précisément ce que cela veut dire. EG demandera des précisions à SECO lors de son prochain passage sur chantier. SECO demande aussi que le remblai en pied de parement soit drainant. MO et AR confirment qu'une bande de gravier de 60cm fait tout le tour de toutes les façades, hormis au droit des terrasses.	EG AR MO SECO
4.7. 21/05/24	<u>Joint entre éléments béton d'acrotère :</u> EG confirme qu'il va rouvrir les joints trop fins entre les éléments d'acrotère, conformément à la demande de SECO. AR précise que le mastic à utiliser est le même que celui des balcons.	EG SECO AR
4.8. 21/05/24	<u>Appartement A6A :</u> EG informe qu'il faut ajouter un faux-plafond dans le hall de nuit pour masquer le raccord de la chaudière vers la gaine technique. MO et AR sont d'accord d'ajouter un faux-plafond suivant le croquis ci-contre.	EG MO AR
		
4.9. 21/05/24	<u>Appartement FOB :</u> EG remarque qu'il y a un isolant autour d'une gaine qui empêche de maçonner entièrement la paroi de la gaine technique. Pour garantir la continuité RF, AR propose d'appliquer en surépaisseur une plaque de Promat 25mm. Le recouvrement entre le Promat et les carreaux de plâtre doit faire minimum 10cm.	AR EG MO

5. STABILITE

6. ARCHITECTURE

6.1. 12/10/23 02/02/24	<u>Local vélos :</u> EG et MO choisissent une finition plafonnée pour les murs silico sauf pour les murs de la cage d'escalier qui doivent être isolés.	
--	---	--

	AR confirme que le local vélo est dans le volume protégé et que par conséquent l'isolant n'est pas nécessaire au niveau de la cage d'escalier.		
21/05/24	Une série de tuyaux de gaz montent dans le coin du local vélo. Sur question de EG, MO est d'accord de prévoir une fermeture en maçonnerie pour protéger les tuyaux. Ailleurs dans le local, il y a une gaine non utilisée. EG demande si on la conserve. Vu son encombrement, AR propose de la supprimer pour laisser plus de place aux vélos. Idem pour la cave n°42 au SS-1, la trémie est supprimée.	AR MO EG	
6.2. 16/11/23 29/03/24	<u>Porte SAS ascenseur sous-sol -1 :</u> AR a transmis les FT des ferme-portes avec retard. On ne prévoit pas de ferme-portes avec retard pour les portes de chacun des locaux vélos, uniquement pour la porte du couloir des locaux vélos et la porte à la sortie du sas ascenseur.	AR EG	
6.3. 01/03/24 15/03/24	<u>Finition porte sectionnelle entrée parking :</u> Les détails d'encadrement de porte seront finalisés avec le placeur de la porte lorsqu'il sera désigné.	EG AR	PM
6.4. 29/03/24 05/04/24	<u>Local rangement au-dessus de l'ascenseur vélo :</u> EG propose de mettre une chape plus épaisse (10cm au lieu de 5-6cm) pour éviter les fissures. Il n'y a pas de contraintes de hauteur sous plafond. MO et AR acceptent. EG précise que la porte qui donne dans le local est une double porte avec deux feuilles de porte de 48cm. La hauteur du linteau sera adaptée. OK de tous.	EG AR MO	
6.5. 29/03/24	<u>Garde-corps :</u> Sur question de EG, MO et AR confirment qu'on met des garde-corps partout où il n'y a pas de terrasse. Pour l'appartement A.0.B., le garde-corps est maintenu uniquement devant la partie double ouvrant et est donc supprimé sur la partie fixe.	AR	
6.6. 29/03/24 12/04/24 30/04/24 21/05/24	<u>Séparation entre parking public et parking privatif :</u> EG précise qu'il y a des gaines de ventilation qui passent au plafond au dessus de la porte sectionnelle dessinée. De ce fait, en position ouverte, on aurait bien moins que les 2m10 recommandés. EG propose de réduire la largeur de la porte sectionnelle en prévoyant une tête de mur latérale. L'ouverture de la porte passe à côté des gaines. MO et AR acceptent. EG propose une tête de mur de 40cm à droite de la porte sectionnelle et 100cm à gauche. EG doit vérifier le débit d'air susceptible de passer par cette porte. La ligne de sprinklage qui se trouve dans l'encombrement de la porte sectionnelle doit être légèrement modifiée : il faut supprimer les suspentes sur la largeur de la porte. MO demande à EG et EG/TS de vérifier s'il n'y a pas d'autre option de fermeture de la partie privative du parking (porte coulissante latérale, porte accordéon).	MO AR EG	
6.7. 05/04/24 30/04/24 21/05/24	<u>Halls d'entrée :</u> EG précise qu'il a commandé, sur base des coupes à sa disposition, les châssis des portes intérieures d'une hauteur de 250cm, pour les six halls. AR prévoit les détails et les plans pour chaque hall. AR doit définir la couleur des halls. Rappel : Encore à faire.	EG AR	
6.8. 23/04/24 30/04/24 21/05/24	<u>Peinture des acrotères en béton :</u> AR précise que suite à la discussion en interne, la peinture des acrotères en béton doit être ton sur ton par rapport aux briques de parement. AR cherchera des références de RAL et les transmettra à EG pour les FT. Rappel : encore à faire. AR a décidé du RAL 9002 – « Gris blanc ».	AR EG	
6.9. 21/05/24	<u>Dauphins et DEP alu :</u> Vu que toutes les DEP sont encastrées dans façade, EG demande s'il est nécessaire de prévoir des dauphins en pied de DEP. AR a vérifié dans le document de PU et il est bien indiqué que les DEP doivent être intégrées dans l'épaisseur de la façade. Par contre, rien est précisé quant à l'utilisation de dauphins. AR et MO sont d'accord de supprimer les dauphins partout dans les zones de plantation. Restent seulement les dauphins à gauche de l'entrée du parking et à gauche de l'entrée de l'ascenseur vélo.	EG AR MO	

7. GESTION ACQUEREURS

7.1.	14/12/23	<u>Appartement témoin :</u>		
		MO confirme que l'appartement E.I.B. servira d'appartement témoin et sera réceptionné en mai 2024. Les finitions de cet appartement seront aussi valables pour le lot F voisin. Le planning et la sécurité des accès sera à mettre en place avec EG. Il faudra également soigner les abords à rue du côté de l'entrée de l'appartement E.I.B.		
		12/04/24 MO et MO/COMM proposent le RAL 9010 pour la peinture des murs, plafond et portes de l'appartement témoin, ainsi que pour la peinture des communs.		
		Note hors réunion: MO et MO/COMM ont confirmé le RAL 9010 pour l'appartement témoin.		
		30/04/24 La réception de l'appartement témoin est prévue pour fin mai (avec peinture). La réception du DF et du raccordement chauffage se fera mi-juin. EG doit vérifier si une alimentation électrique provisoire est nécessaire pour la mise en route du chauffage.		
7.1.	14/05/24	EG doit revenir avec une date pour la réception de l'appartement témoin.	MO	
		21/05/24 MO propose le mardi 4 juin à 11h. EG précise que la RP sera uniquement esthétique parce qu'il n'y aura pas encore électricité/eau/chauffage au moment du 4/06/24.	MO/COMM EG	
7.2.	26/01/24	<u>Planning choix MO appartements invendus :</u>		
		02/02/24 S'il y a une vente, MO/COMM contactera en fonction EG ou DESCO. MO/COMM prévoira un mémo pour le vendeur : plus de choix possible sauf au cas par cas.	MO/COMM EG MO	PM
7.3.	12/04/24	<u>Organigramme des clés :</u>		
		Sur question de EG, MO précise qu'il n'est pas encore possible de faire le lien entre chaque cave et l'appartement correspondant. On ne peut pas encore réaliser les cylindres de cave car selon les caves l'épaisseur de porte diffère (EI30/EI60). Il est convenu que les appartements et caves invendus sont provisoirement équipés d'un cylindre « I90 ». MO referra des nouveaux cylindres en cas de vente.	EG MO	
7.3.	21/05/24	MO/COMM doit transmettre à EG la correspondance entre les appartements vendus et les caves vendues pour associer les cylindres.		
7.4.	15/03/24	<u>Journée chantier ouvert (visite avec les acquéreurs):</u>		
		MO prévoit d'organiser une visite du chantier pour les acquéreurs. La date est à définir au mois de mai / juin. Le principe est que toutes les chapes soient terminées. L'appartement témoin doit aussi être terminé pour cette date. Pour info, la peinture est commandée à EG. MO/COM a entamé les discussions avec l'entreprise qui se chargera de l'aménagement mobilier de l'appartement.		
7.4.	12/04/24	MO propose la date du 21 juin de 14h à 17h, à confirmer par MO.	EG MO	
		14/05/24 MO et MO/COMM confirment l'après-midi du 21 juin.	MO/COMM	
7.5.	12/04/24	<u>Visites vendeur + acquéreur potentiel :</u>		
		MO doit définir une procédure (prévenir à l'avance, se présenter et signer le document de présence, recevoir les consignes de sécurité et les clés). EG prévoira un cabanon avec les équipements nécessaires (casques, chaussures de sécurité).		
7.5.	14/05/24	EG ne peut pas promettre une circulation sécurisée sur le chantier donc les EPI seront prévus dans le bureau de vente.		
		21/05/24 EG informe que deux portes seront rajoutées dans les barrières HERAS devant les entrées du bloc A et B. Il faut également prévoir un chemin d'accès propre (gravier devant les entrées).	MO EG	
7.6.	12/04/24	<u>Journées portes ouvertes :</u>		
		Elles sont organisées 1x/mois. MO précise que les personnes qui viennent le WE doivent se présenter le vendredi pour recevoir les consignes de circulation sur chantier et récupérer les clés.	MO EG	

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

8.1.	27/04/23	<u>Prochaine réunion TS :</u>		
		05/04/24 EG/TS n'est pas disponible le mardi pour participer aux réunions. Par conséquent, TS fera des réunions avec EG/TS le vendredi et transmettra ses remarques par mail pour intégration dans le PV du mardi suivant.	TS EG/TS	
8.2.	23/02/24	<u>Contrôle de l'exécution :</u>		
		TS rappelle qu'il a demandé le planning de fermeture de trémie. EG/TS le transfère.		

08/03/24	EG/TS a transmis le planning à TS. EG/TS envoie copie du planning à AR pour info.	EG/TS TS
22/03/24	EG informe que les trémies sont prêtes pour fermeture. TS prévoit de passer dans les blocs C et D pour vérifier.	
05/04/24	Trémies blocs C et D : pas terminé pour l'électricité donc le nettoyage et le resserrage RF entre les niveaux est à terminer.	
8.3.	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants – SIBELGA - Electricité :</u>	
27/09/22	<u>Cabine HT :</u>	
23/02/24	EG/TS a vérifié le délai annoncé de mai 2024 pour l'introduction des câblages HT et BT ; Le délai ne peut pas être compressé. EG/TS annonce que la cabine HT sera installée mi-juin 2024.	
22/03/24	L'introduction des câblages est prévue à partir du 6 mai 2024.	
05/04/24	EG/TS confirme que l'introduction des câblages HT se fera à la mi-juin et l'introduction des câblages BT est prévue le 21 mai 2024.	
30/04/24	SIBELGA décale l'introduction des câblages BT au 27/05. EG prévoit de pouvoir ouvrir les premiers compteurs le 15/06 pour le gaz et l'électricité.	EG MO EG/TS
14/05/24	Une réunion de coordination se tiendra le jeudi 16/05/24 avec SIBELGA, VIVAQUA et PROXIMUS pour le démarrage du chantier d'introduction des impétrants.	
8.4.	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants – SIBELGA - Gaz :</u>	
26/10/23	L'introduction est prévue mi-mai en même temps que la BT.	
23/02/24	L'introduction du gaz est prévue le 21 mai 2024, en même temps que la BT.	EG EG/TS MO
05/04/24	SIBELGA décale l'introduction du gaz au 27/05, en même temps que la BT. EG prévoit de pouvoir ouvrir les premiers compteurs le 15/06 pour le gaz et l'électricité.	
30/04/24		
8.5.	<u>Gestion partie « publique » du parking :</u>	
17/08/23		
09/02/24	La proposition du fournisseur ne convient pas à MO. MO demande de mettre à jour l'offre incluant un lecteur de plaque, l'ouverture d'ascenseur coté rue avec code à 4 chiffres et la gâche électrique pour l'escalier côté rue.	
22/03/24	En cours. EG a relancé le fournisseur pour une nouvelle offre.	EG MO
14/05/24	MO va faire un rappel au sous-traitant.	
8.6.	<u>Entrée des impétrants - PROXIMUS :</u>	
28/09/23		
09/02/24	L'intervention de Proximus pour la visite technique est prévue pour le 15 mai. MO doit confirmer mi-avril que le câblage fibre des appartements est prêt.	
23/02/24	EG confirme que les précâblages des fibres optiques des appartements seront bien finis pour cette date.	
08/03/24	Reste à définir de quelle manière les bornes électriques seront connectées à Internet. Est-ce que la copropriété doit prévoir une connexion internet, ou bien est-ce EDI qui s'en charge.	
	En fonction du choix, un / des départs supplémentaires devront être prévus dans le bornier PROXIMUS.	
05/04/24	L'intervention Proximus est prévue le 21 mai en même temps que BT et gaz. MO doit confirmer la date à Proximus.	MO
8.7.	<u>Raccordement eaux usées/eaux pluviales à l'égouttage public :</u>	
05/10/23		
08/03/24	Toujours pas de nouvelle.	
	EG précise que sans les informations précises sur ces raccordements, il ne sait pas planifier les interventions sur les abords.	
	EG demande que les infos utiles lui soient communiquées au plus tard le 19 avril.	AR TS MO
15/03/24	MO a reçu le rapport de HCO hier. MO va l'analyser et le transmettre.	
22/03/24	AR envoie à TS un plan avec les surfaces de balcons et de terrasses reprises par les DEP.	
05/04/24	AR complète son plan avec les DEP. MO prend contact avec VIVAQUA pour le raccordement supplémentaire.	
8.8.	<u>Gestion des bornes de recharge voitures électriques :</u>	
12/10/23	La localisation des armoires de gestion des bornes de recharge voitures doit encore être finalisée.	
09/02/24	Précision sur la limite d'intervention de EG : EG doit prévoir le départ TGBT avec asservissement incendie et bouton poussoir d'arrêt d'urgence à l'entrée du parking. EG doit aussi prévoir les chemins de câble au plafond du SS -2. Les autres interventions seront à charge de EDI.	MO EG
14/05/24	MO précise qu'une borne vient d'être commandée par un acquéreur.	

8.9. 08/03/24 05/04/24 14/05/24	<u>Volet Rf rampe :</u> Il y a confusion entre les plans AR et TS. TS a bien prévu un rideau Rf 60'. Vérification rapport pompiers : Rien de précis n'est indiqué mais TS confirme qu'il est bien prévu une barrière El60' pour permettre la séparation des 2 niveaux de parkings en 2 compartiments feu séparés. AR et TS préparent un mail afin de questionner les pompiers. Sur base des indications données par TS, il n'est pas nécessaire de prévoir un volet dans la rampe. A confirmer par TS.	AR TS	
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.10. 27/04/23 26/01/24 8.11. 09/02/24 23/02/24 8.12. 08/03/24 22/03/24 05/04/24 8.13. 05/04/24	<u>Cabine haute tension :</u> EG/TS précise avoir indiqué une cabine à réarmement motorisée dans son offre et un TGBT de 630 KVA avec 8 départs (6 départs communs + 1 départ communs SS + 1 départ bornes voitures). Le délai prévisionnel annonce la mise en place des cabines des communs avant les congés estivaux. Sur question de TS, EG/TS confirme que le TGBT sera bien placé dans le local basse tension, position exacte à définir par EG/TS. <u>Mise à la terre des installations :</u> EG/TS vérifie avec le ST électricité les régimes de terre à prévoir pour les différents circuits (BT, HT). En cours. <u>Réseau ASTRID sous-sols :</u> TS rappelle à EG de prévoir des tests pour vérifier la nécessité de placer des antennes relais pour le réseau ASTRID dans les 2 sous-sols ou seulement au -2. Et surtout, ne pas oublier de placer le câblage nécessaire dans les trémies techniques, vers les antennes en toiture du A. EG/TS informe que c'est prévu le 3 et 5 avril et que le chemin de câble sera placé la semaine prochaine (SEM 13). A finaliser. <u>Groupe électrogène :</u> TS vérifie les normes de distances minimales entre cheminées/sortie échappement groupe électrogène et terrasses des appartements.	TS EG/TS EG/TS EG/TS TS EG/TS	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.14. 12/01/24 26/01/24	<u>Décalage des tuyaux en toiture :</u> Les plans de ventilation en toiture ont été déposés sur Cooperlink pour remarques ou approbation. Le tuyau de la ventilation qui sort de la trémie T1D doit longer la façade et passer sous l'allège de la fenêtre. AR met à jour son plan. Au droit des trois terrasses sur la toiture plate (3-4-5èmes étages), il y a à chaque fois une trémie proche du conduit d'air vicié de ventilation. TS précise que pour les sorties de gaz brûlé, il était prévu que les rejets d'air soient déviés. EG/TS et TS discuteront de solutions possibles pour les rejets d'air vicié de ventilation.	EG EG/TS	
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.15. 21/09/23 23/11/23 07/12/23 8.16. 23/11/23 12/01/24	<u>Gestion d'humidité/condensation</u> TS préconise de mettre la sonde hygrométrique dans les gaines qui mènent aux caves plutôt qu'à l'extérieur dans le jardin. Suivant conseil de TS, EG/TS fera modifier les ventilations des sous-sols pour pulser l'air dans les couloirs de cavettes et faire les reprises dans les cavettes elles-mêmes. <u>Continuité ventilation parking SS -1 :</u> TS précise qu'il faut conserver un passage d'air (20.000 m³/h) au travers de la porte sectionnelle qui sépare la partie privée de la partie publique du parking. 3 solutions possibles : 1) Partie grillagée dans la porte sectionnelle 2) Espace libre au-dessus de la porte sectionnelle 3) Remplacement du mur entre les places de parking 15 et 16 par une cloison grillagée EG fera une proposition. TS précise que pour une vitesse de 2m/s, on doit prévoir 2.7 m² de libre. On peut accepter une vitesse jusqu'à 2.5m/s – 3m/s pour légèrement réduire la section si	TOUS EG TS MO	

	nécessaire.		
8.17. 09/02/24	<u>Ventilation CO au sous-sol :</u> EG a proposé une tourelle d'extraction à placer en toiture. TS précise qu'en base il était prévu un groupe d'extraction à placer au SS -1 (local dans le bloc F). MO confirme qu'au stade étude ce point avait été discuté et que les nuisances sonores avaient conduit à placer le groupe au SS -1. Ce principe doit être respecté.		
23/02/24	Vu les problèmes de proximité entre le groupe en toiture et les terrasses (nuisances sonores), EG décide de demander à son ST de revenir à la base. AR précise qu'il faut vérifier la dimension de la grille en sortie de trémie ; Dans le dossier d'étude, il est prévu 3.2 m². Cette grille ne peut être orientée vers la terrasse voisine.		
05/04/24	EG/TS doit dimensionner les grilles à prévoir en sortie de trémie en toiture. TS fournira les vitesses recommandées pour le dimensionnement des grilles. EG/TS vérifie avec AC les normes de bruit à respecter en sortie de grille.	EG MO TS	
8.18. 08/03/24	<u>Ventilation caves sous-sol :</u> Les sorties de prise d'air frais et de rejet d'air vicié des caves et couloirs se trouvent dans les abords. AR doit faire es détails de principe de ces prises d'air. Les sorties seront maçonnées avec des rehausses en ventelles idem que les bluekits.		
22/03/24	Encore à faire.	AR	

TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS

8.19. 31/08/23 23/02/24	<u>Vérification des plans d'exécution :</u> EG/TS confirme que KONE va venir pour le mesurage des trémies en vue de la production des ascenseurs. EG/TS précise qu'il existe la possibilité de mettre un demi-cylindre pour l'ouverture de l'ascenseur vélo + un clavier à code.		
08/03/24	Le mesurage des trémies est prévu semaine 12. La pose débutera 6 semaines plus tard. AR précise que pour l'ascenseur vélos, l'encadrement de briques a été ajusté sur les données reprises aux plans de KONE. EG/TS précise que ce qui est représenté sur le plan de KONE n'est pas tout à fait exact. Il n'y a pas de retour de tête de mur. EG/TS prendra les renseignements nécessaires pour vérifier comment faire les raccords avec les briques de parement / porte palière Rez de cet ascenseur.		
22/03/24	Le mesurage a été entamé en semaine 12 et sera finalisé la semaine 13.		
05/04/24	Le mesurage a été fait pour l'ensemble des blocs. La tête de mur est conservée à 1950LR afin d'avoir une protection anti-vandale. Les boîtes à boutons sont encastrées dans le mur et pas dans la tête de mur pour garantir la protection anti-vandale. Le MAP est mis au SS -1. EG/TS vérifie avec KONE que le retrait de la porte est suffisant pour la protéger des intempéries.	EG/TS	

9. CONSEILLER PEB

9.1. 14/09/23 07/12/23	<u>Isolation des sous-sols :</u> Reste encore à solutionner l'isolation à l'interface entre rampe voiture et appartement C.0.B. Pour parler MO propose d'inviter la responsable PEB à la prochaine réunion de chantier.		
12/01/24	EG a proposé à PEB de soigner les détails d'étanchéité à l'air pour améliorer son impact sur la performance globale de l'appartement C.0.B. Le choix de l'isolant se fera en fonction de cette performance.	EG PEB	
9.2. 07/12/23	<u>Choix des vitrages :</u> Pour l'appartement C.0.B., PEB demande de prévoir des vitrages avec un facteur solaire très différent des facteurs solaires des autres châssis du chantier, pour compenser le déficit de performance énergétique de cet appartement. De telles différences de facteur solaire ne sont pas acceptables à cause des différences de teinte de vitrage qui se verront très fortement. Il faut essayer de voir ou il est possible de gagner des points sur d'autres aspects de l'enveloppe de cet appartement, pour pouvoir garder des vitrages semblables aux vitrages voisins. Des pistes possibles sont : Meilleure étanchéité à l'air de cet appartement Majorer les épaisseurs d'isolants si c'est encore possible (façades, mur d'interface avec rampe parking)		

14/12/23 12/01/24	Placer plus de panneaux solaires pour cet appartement. Il y a une réunion prévue avec PEB le vendredi 15/12/23. Suite à la réunion du 15/12/23, PEB a encore modifié certains éléments qui avaient pourtant été validés en réunion.	PEB	
9.3. 09/02/24	<u>Isolation en pied de façade :</u> Un isolant 20cm était prévu en base. PEB demande maintenant de passer à un isolant 25cm. EG vérifie avec EPB s'il est possible de rester en 20cm.	EG PEB	
9.4. 09/02/24 21/05/24	<u>Localisation des isolants en façade :</u> AR a transmis la localisation des isolants PUR 25cm pour les quatre appartements concernés au rez-de-chaussée (blocs A et C). EG précise que l'isolation renforcée (25cm PUR) demandée en façade rez du bloc C n'a pas été mise en œuvre. Ce sont 25cm de LM qui ont été mis donc il faut trouver d'autres points d'amélioration de la PEB de l'appartement C0B. Selon EG, c'est en se plantant qu'on fait ses racines ☺. EG doit faire un test d'étanchéité à l'air le plus rapidement possible. Une fois les résultats connus, EG doit programmer une réunion avec PEB pour discuter des possibilités d'amélioration.	AR EG	
10. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
10.1. 26/10/23	<u>Présence de CSS aux réunions de chantier :</u> MO précise qu'il faut organiser des réunions régulières de la cellule de coordination, en présence de tous les bureaux d'études et de l'entreprise. MO contacte CSS afin d'organiser de telles réunions régulièrement.	MO CSS	
11. ACOUSTIQUE			
11.1. 26/10/23	<u>Approbation des FT :</u> EG rappelle qu'AC doit approuver les FT qui la concerne sur Cooperlink. EG contacte AC pour mise à jour.	EG AC	
12. ABORDS			
12.1. 06/07/23 14/09/23	<u>Terrasse appartement D.0.A :</u> ABO doit encore faire la mise à jour de son plan d'aménagement pour rajouter la terrasse de l'appt D.0.A. Solution pour aménagement de cette terrasse encore à mettre au point chez ABO.	ABO	
12.2. 14/09/23 23/11/23	<u>Aménagement patio central :</u> MO demande à ABO de faire des propositions de variantes pour réduire les coûts des bancs et tables, ainsi que les coûts des bordures en acier corten délimitant les zones de gravier. Le plan mis à jour a été transmis par mail.	ABO	
12.3. 16/11/23	<u>Encombrement poutre au -1 à l'angle du bloc A :</u> En fonction de l'encombrement de la poutre emballée, il faudra vérifier qu'il n'y a pas de modifications des abords pour le chemin de gravier périphérique.	ABO	
12.4. 14/12/23	<u>Zones de plantations sous les balcons :</u> MO a discuté avec ABO au sujet de la mauvaise reprise des plantes dans les parterres sous les balcons. Il faut prévoir des plantes demandant peu d'eau (fougères, lierres) ou des aménagements minéraux (gravier pierres de rocaille).	ABO MO	
13. POINTS POUR MEMOIRE			
13.1.	ARCHITECTURE <u>Parement façade :</u> Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771		

Balcons béton architectonique :

Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70

Choix teinte joint balcon : SOUDASEAL 215LM – Ref teinte : Gris béton

Châssis :

Choix teinte IN et OUT : RAL 6012 Mat (vert noir)

Profilé de marque ALUK et modèle Triton Revive

Acrotères en béton :

Teinte RAL 9002 (gris blanc)

DEP :



Teinte RAL 6012 Mat (vert noir)

Escaliers :

Choix teinte garde-corps intérieurs : RAL 9005

Sol locaux communs :

Quadrus



Carrelage murs appartements :

Concernant le carrelage des salles de bain/douche des blocs D-E-F (grande hauteur), si le faux plafond se situe en dessous de 250 cm, le carrelage est posé sur toute la hauteur. Si le faux plafond se situe au-dessus de 250cm, le carrelage est posé à hauteur de porte avec un module entier et le carrelage coupé se trouve au niveau du sol.

Dans le descriptif commercial, il est indiqué que les carrelages vont partout jusqu'au plafond. Donc, dans les blocs D, E & F, on place les faux-plafonds à 270cm.

Dans les autres cas, on va jusqu'au plafond ou jusqu'au faux plafond quand il y en a un.

STABILITE

13.2.

TECHNIQUES SPECIALES

13.3.

Choix des sous-traitants :

<u>Chauffage :</u>	CAUVIN
<u>Sanitaire :</u>	LEGRAND
<u>Ventilation :</u>	BELVENT
<u>Electricité :</u>	HIFLOW
<u>Sprinklage :</u>	IFC
<u>Astrid :</u>	CONNEXT
<u>Ascenseurs :</u>	KONE.
<u>Châssis :</u>	ARALU

PEB

13.4.

ABORDS

13.5.

02/02/24

Clotûres Bekaert :

MO propose de choisir les clotûres Bekaert en colori noir pour éviter de dissoner avec la couleur verte des châssis et des garde-corps. AR regarde en interne.
